


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего	609
1.1	В т.ч. кабель	409
1.2	В т.ч. СИП	200
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	7
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.1)	409	АПвВБШп
2	Ф.1(оп1-оп.7)	200	СИП2 3х95+1х95
3	Ф.2 (оп.8-14)	198	СИП2 3х95+1х95
4	Ответвления к домам		СИП 4х16, СИП 2х16

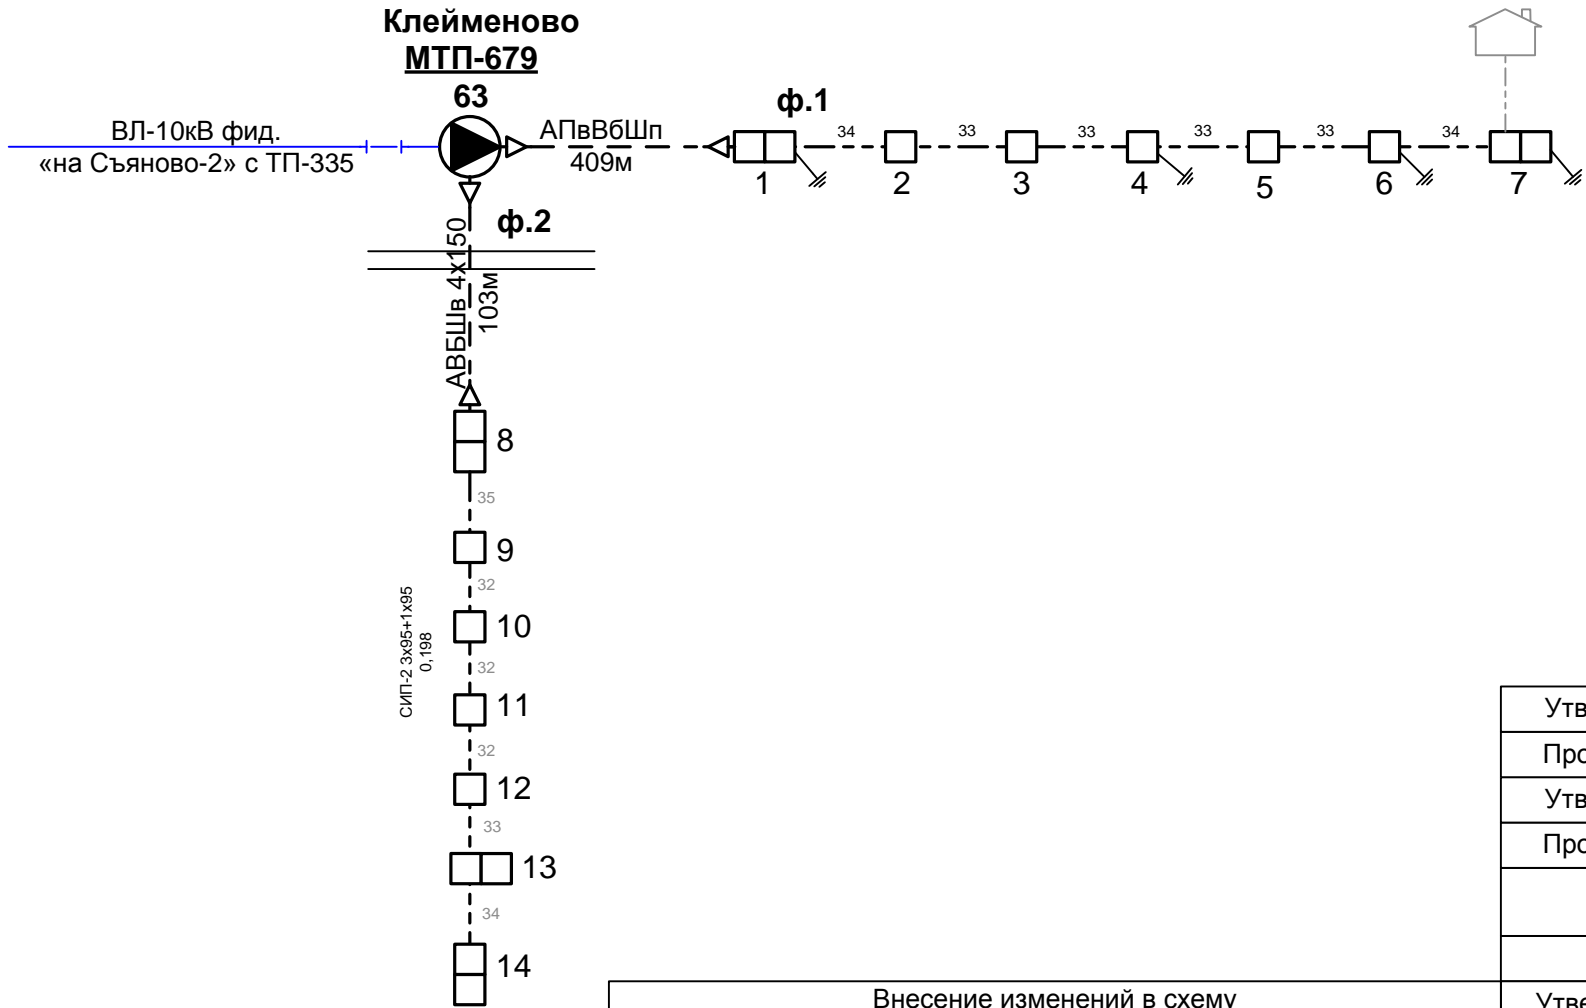

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с МТП-679 д.Клейменово				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	и.о.начальника	Акованцев А.И.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	вед.инженер	Косарев О.А.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
