


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(КТП-оп.27)	90	А-35
2	Ф.2(КТП-оп.36)	280	СИП 3х95+1х95
3	Ф.2(оп.36-оп.55)	760	А-35
4	Ф.2(оп.39,56-62)	250	СИП 3х70+1х70
4	Ф.2(оп.32,70-80)	440	А-35
4	Ф.2(оп.74,81-85)	140	СИП 3х50+1х50,4
4	Ф.2(оп.81,86-91)	210	СИП 3х50+1х50,4
4	Ф.3(КТП-оп.13)	388	СИП 3х95+1х95
4	Ф.2(оп.13-24)	388	СИП 3х50+1х50,4
5	Ответвления к домам	1220	А-16,А-25,СИП

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2946
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1656
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	102
3	В т.ч. абонентских	1
4	Однофазные вводы	48
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные вводы	13
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

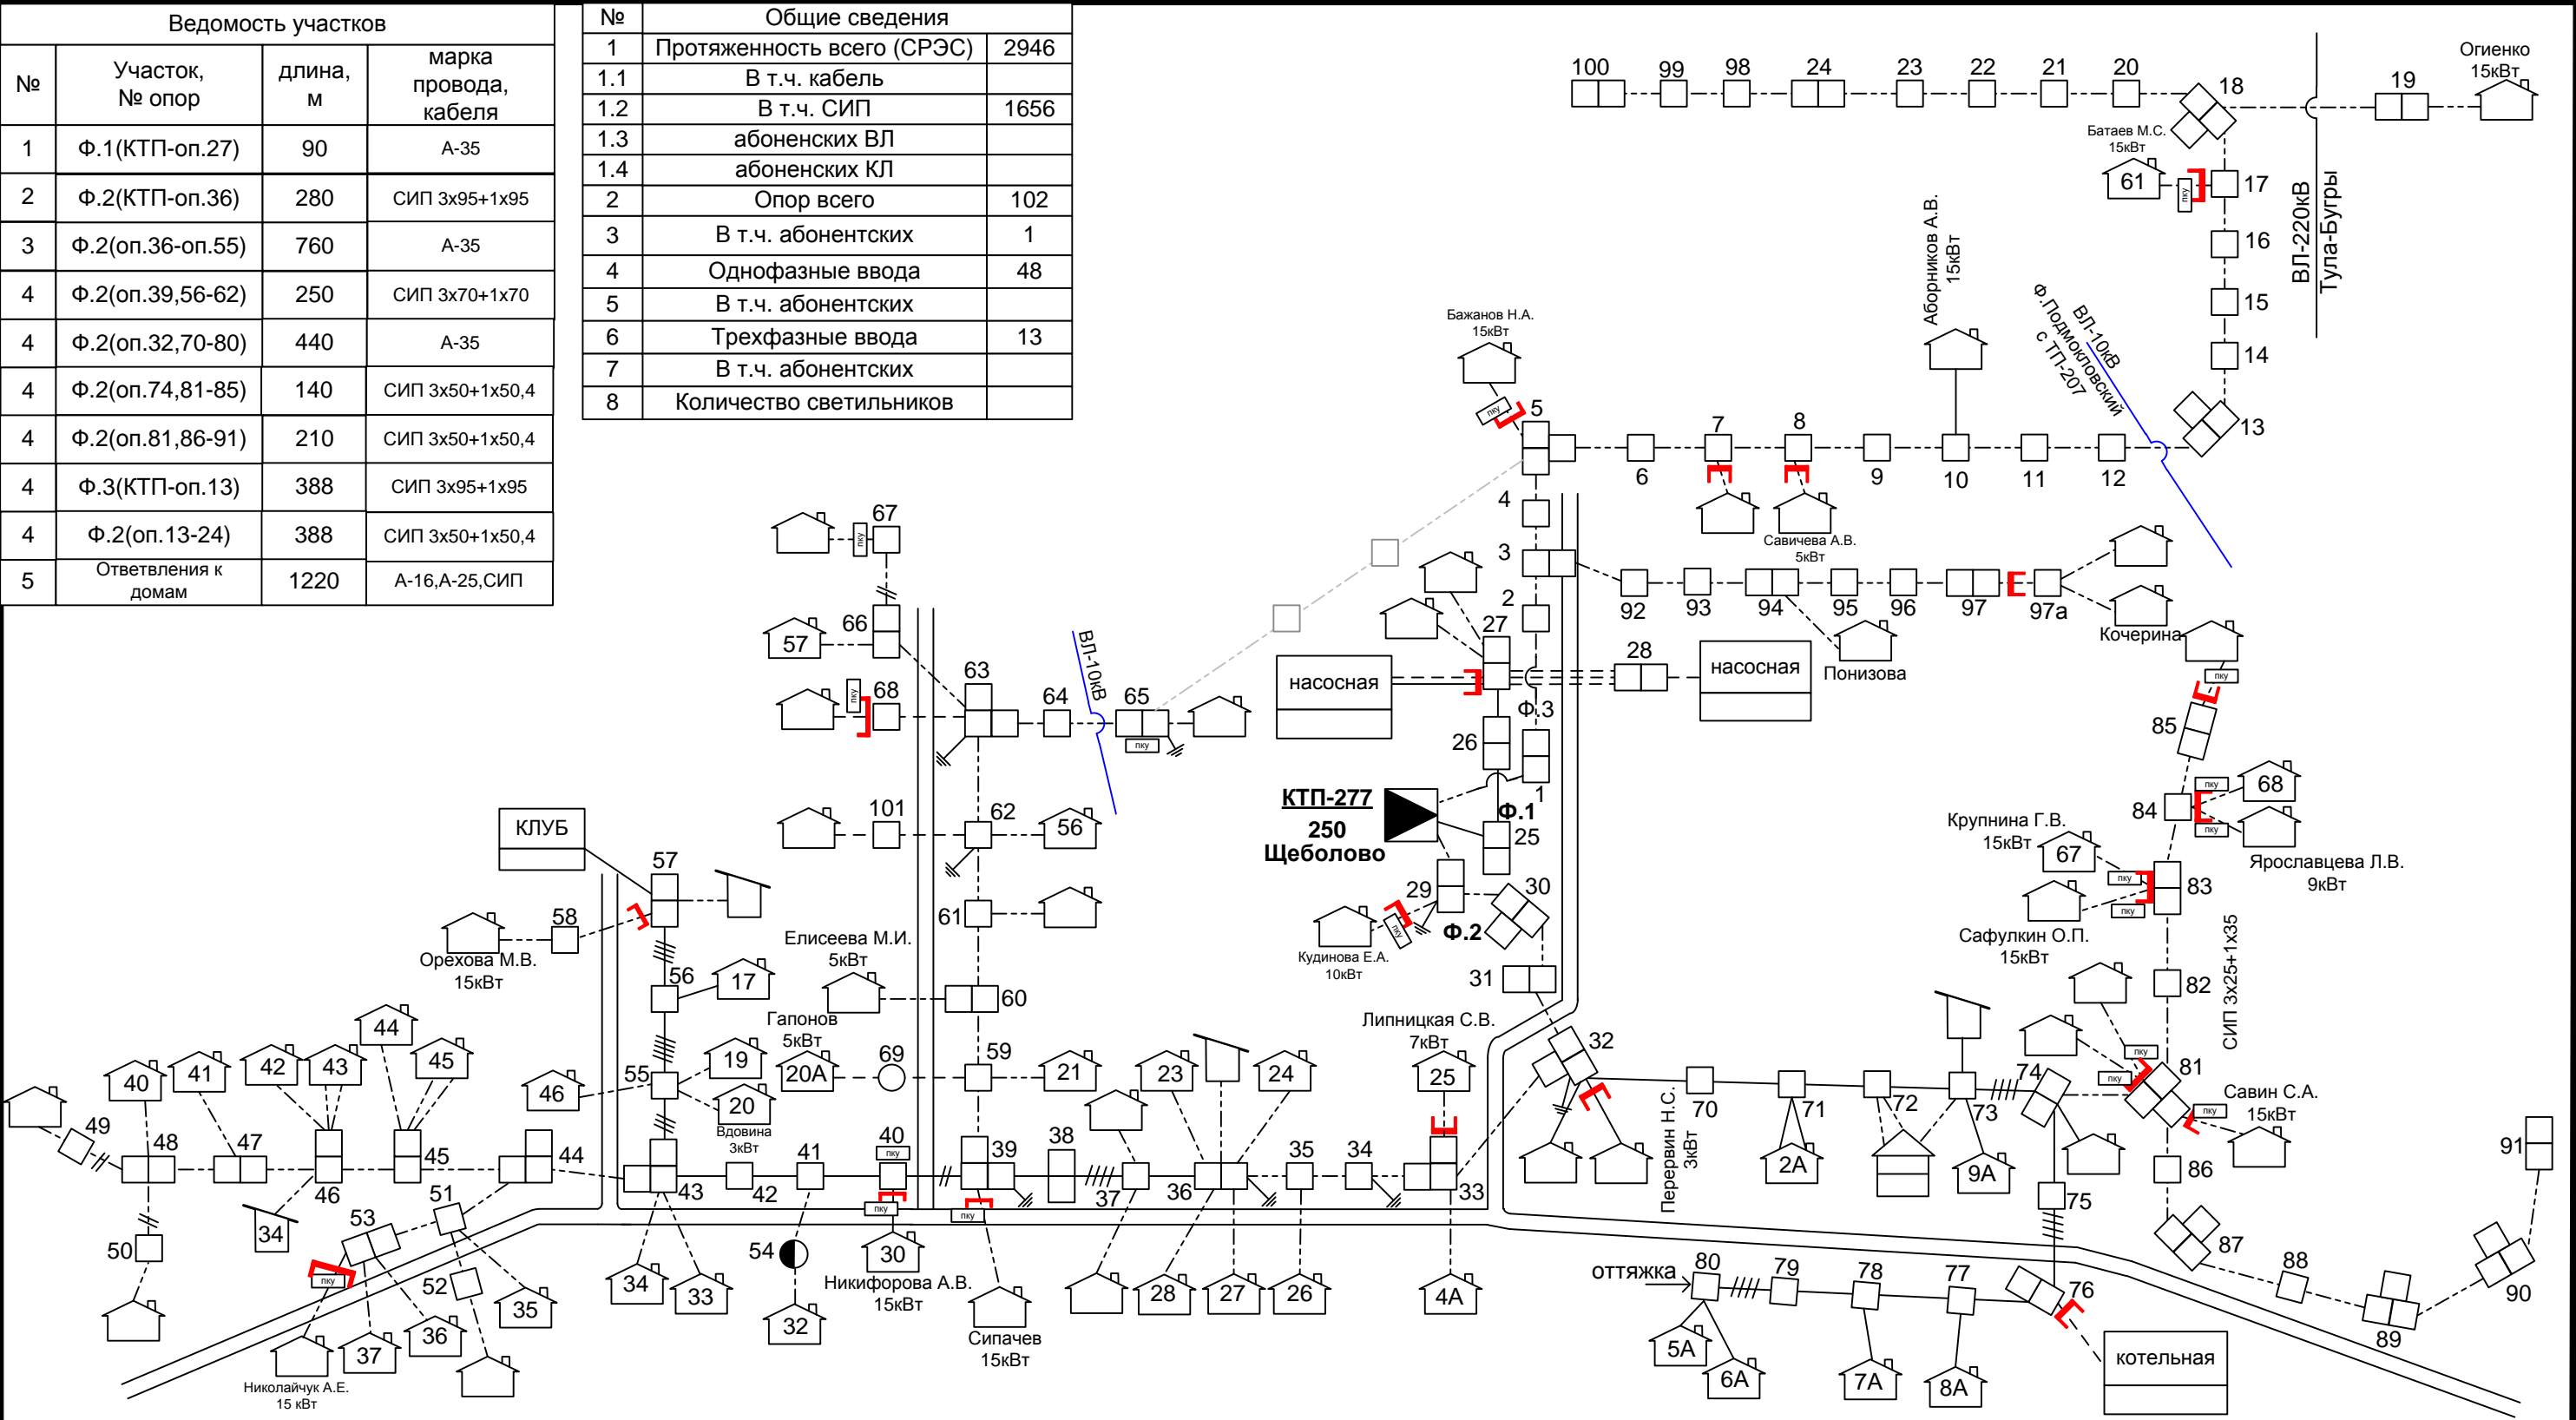

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-277 Щеболово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.мпециалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
