
Nº	Общие сведения	
	Оощие сведения	
1	Протяженность всего	1060
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	120
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	120
1.4	1.4 В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	25
3	кол-во линейных	
3	разъединителей	
4	Однофазные ввода	26
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	1
7	В т.ч. абонентских	1
8	Количество светильников	

Ведомость участков					
Nº	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля		
1	Ф.1(МТП-оп.24)	940	A-35		
2	Ф.1(17а-26)	120	СИП 2х16		
3	Ответвления к домам	600	A-16, A-25, СИП 2x16		

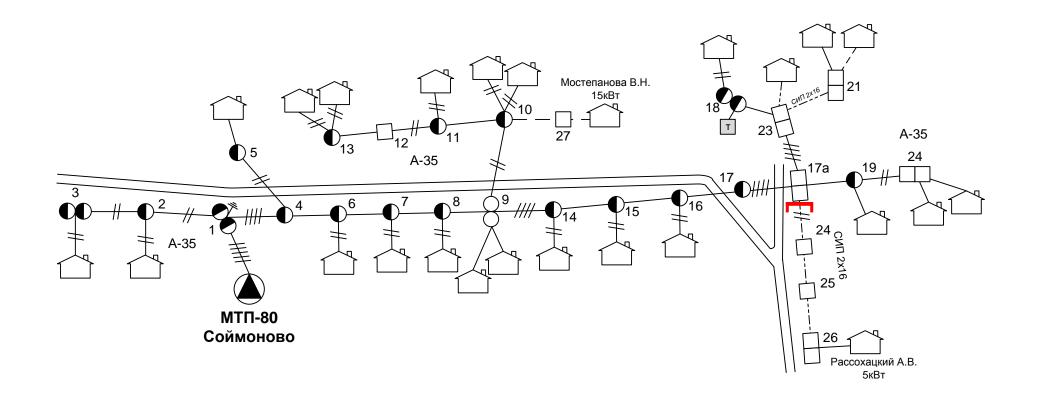

Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-80 Соймоново СРЭС

<u>L</u>										
					Должность	Фимилия И.О.	Дата	Подпись		
Внесение изменений в схему			Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	09.04.14				
Nº	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись	Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	09.04.14	
						Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	09.04.14	
						Чертил	техник	Буева М.С.	09.04.14	
