
	Ведомость участков					
Nº	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля			
1	Ф.1 (БМКТП-оп.4)	107	СИП2 3х95+1х95			
2	Ф.2 (БМКТП-оп.11)	200				
3	Ответвления к домам					

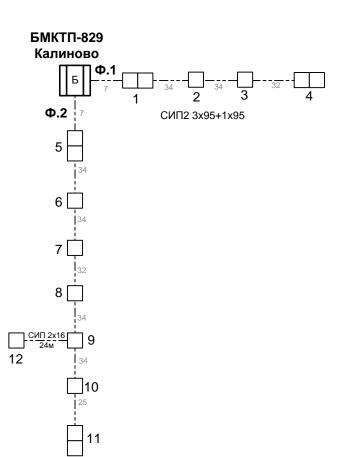

Nº	Общие сведения					
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,307				
1.1	В т.ч. кабель, км					
1.2	В т.ч. СИП, км	0,307				
1.3	абоненских ВЛ, км					
1.4	абоненских КЛ, км					
2	Опор всего, шт.	12				
3	В т.ч. абонентских, шт.					
4	Однофазные ввода, шт.					
5	В т.ч. абонентских, шт.					
6	Трехфазные ввода, шт.					
7	В т.ч. абонентских, шт.					
8	Количество светильников, шт.					

Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-829 Калиново СРЭС

				i de la companya de						
							Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Внесение изменений в схему				Утвердил	Гл. инженер	Казаков С.В.	02.04.15			
√o	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись	Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.	02.04.15	
						Проверил				
						Чертил	инженер	Буева М.С.	02.04.15	
