


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2,803
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,212
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	81
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные вводы	52
5	В т.ч. абонентских	1
6	Трехфазные вводы	2
7	В т.ч. абонентских	2
8	Количество светильников	12

082-9932057

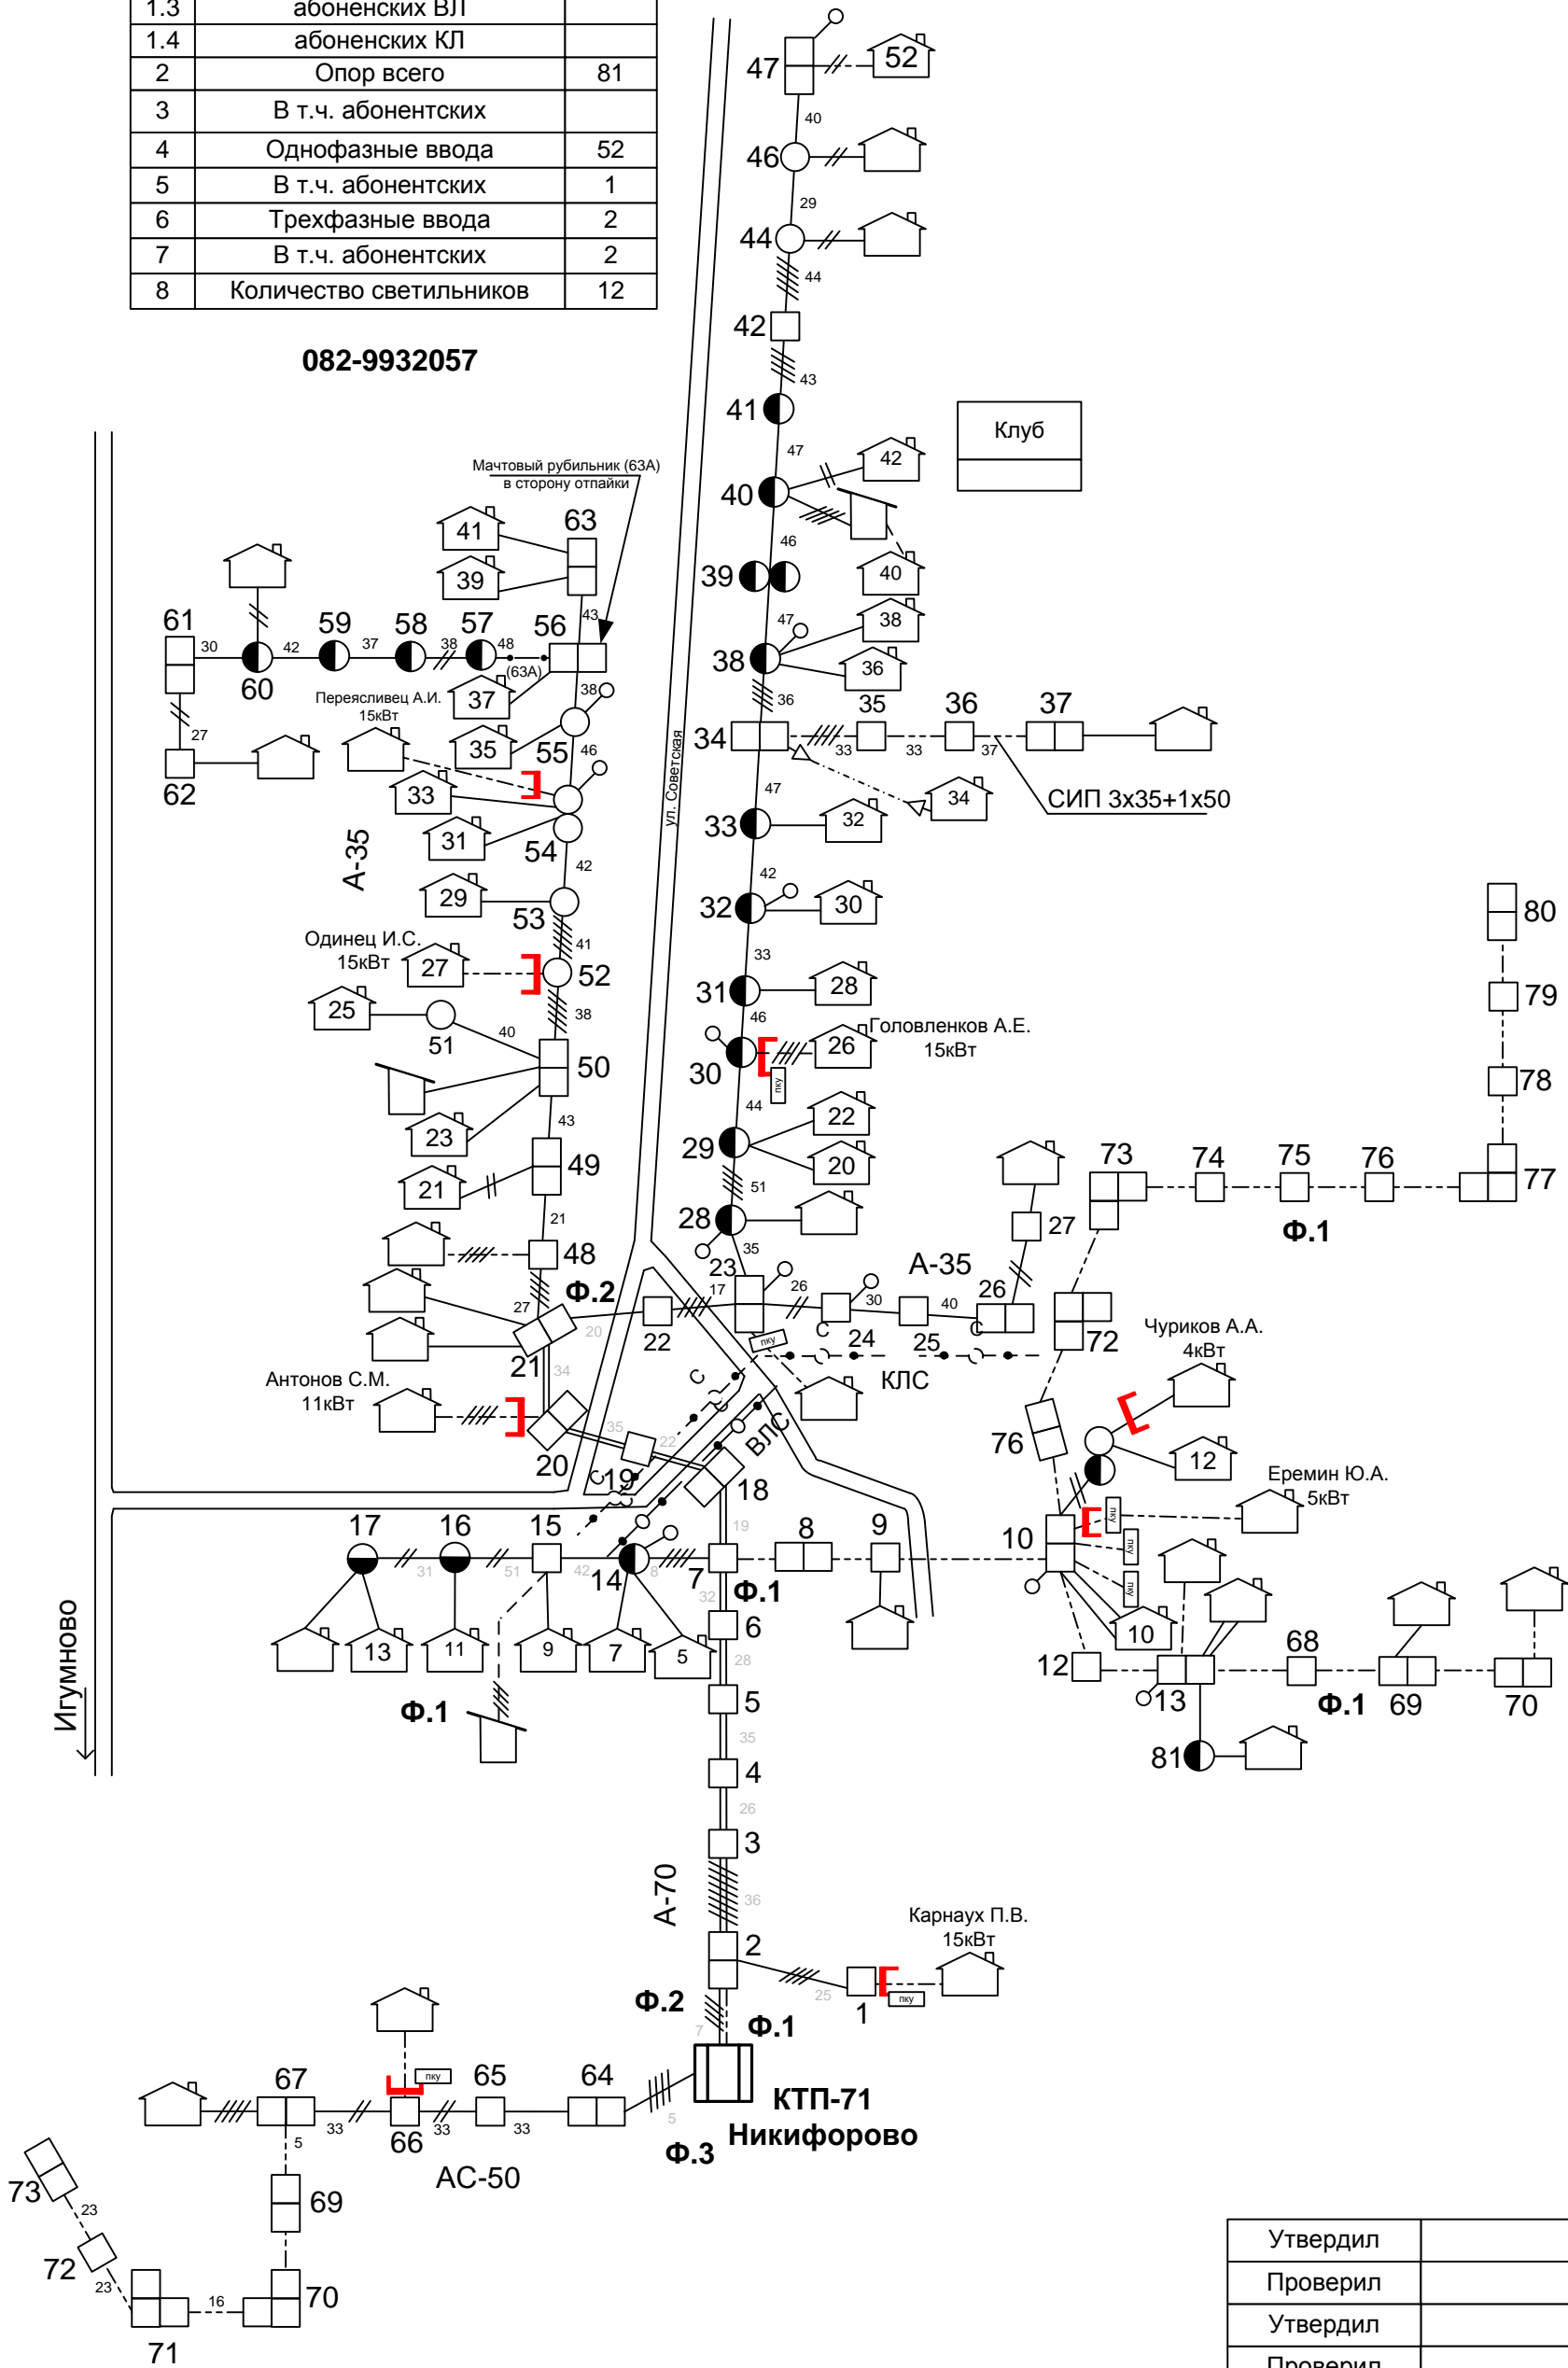

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.2)	7	СИП 4x50
2	Ф.1(оп.2-21)	267	А-70
3	Ф.1 (КТП-оп.7)	164	А-35
4	Ф.2(МТП-оп.21)	274	А-70
5	Ф.2(оп.21-47)	783	А-35
6	Ф.2(оп.34-37)	103	СИП 3x35+1x50
7	Ф.2(оп.42,69-85)	402	СИП2 3x95+1x95
6	Ф.2(оп.77,86-87)	70	СИП2 3x95+1x95
7	Ф.3(МТП-оп.67)	103	АС-50
8	Ответвления к домам	1020	А-16, А-25, СИП 2x16
9	Ф.1 (оп.7-10-80)	455	СИП-2 3x95+1x95
10	Ф.1 (оп.10-70)	175	СИП-2 3x95+1x95

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-71 Никифорово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	И.о. начальника	Казakov С.В.	14.09.16	
Согласовал	мастер	Головлёнков А.Е.	14.09.16	
Проверил				
Чертил	Инженер	Протасова М.С.	14.09.16	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
