


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),м	1240
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1240
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор СРЭС, шт	37
3	Опор абонентских, шт	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	БМКТП-оп.37	1240	СИП 2 3х95+1х95
2	БМКТП-оп.3-10-19	595	СИП 2 3х95+1х95
3	Ответвления к домам		

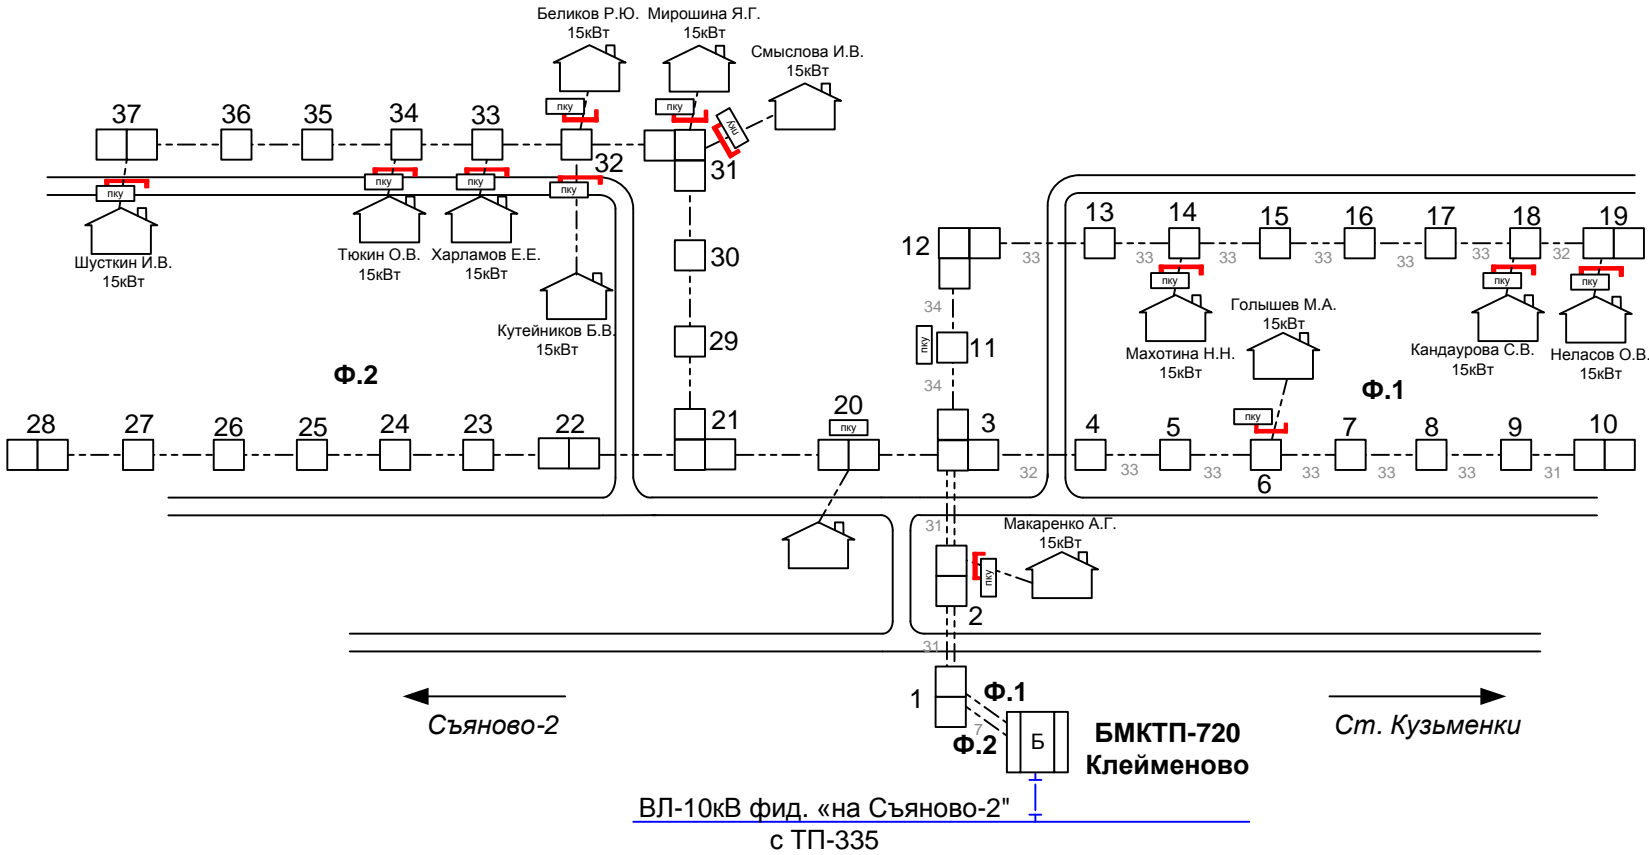

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-720 д.Клейменово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
