


| № | Общие сведения | |
|-----|----------------------------|-------|
| 1 | Протяженность всего (СРЭС) | 1,435 |
| 1.1 | В т.ч. кабель | |
| 1.2 | В т.ч. СИП | |
| 1.3 | абоненских ВЛ | |
| 1.4 | абоненских КЛ | |
| 2 | Опор всего | 64 |
| 3 | В т.ч. абонентских | |
| 4 | Однофазные ввода | 23 |
| 5 | В т.ч. абонентских | 4 |
| 6 | Трехфазные ввода | 1 |
| 7 | В т.ч. абонентских | 1 |
| 8 | Количество светильников | 6 |

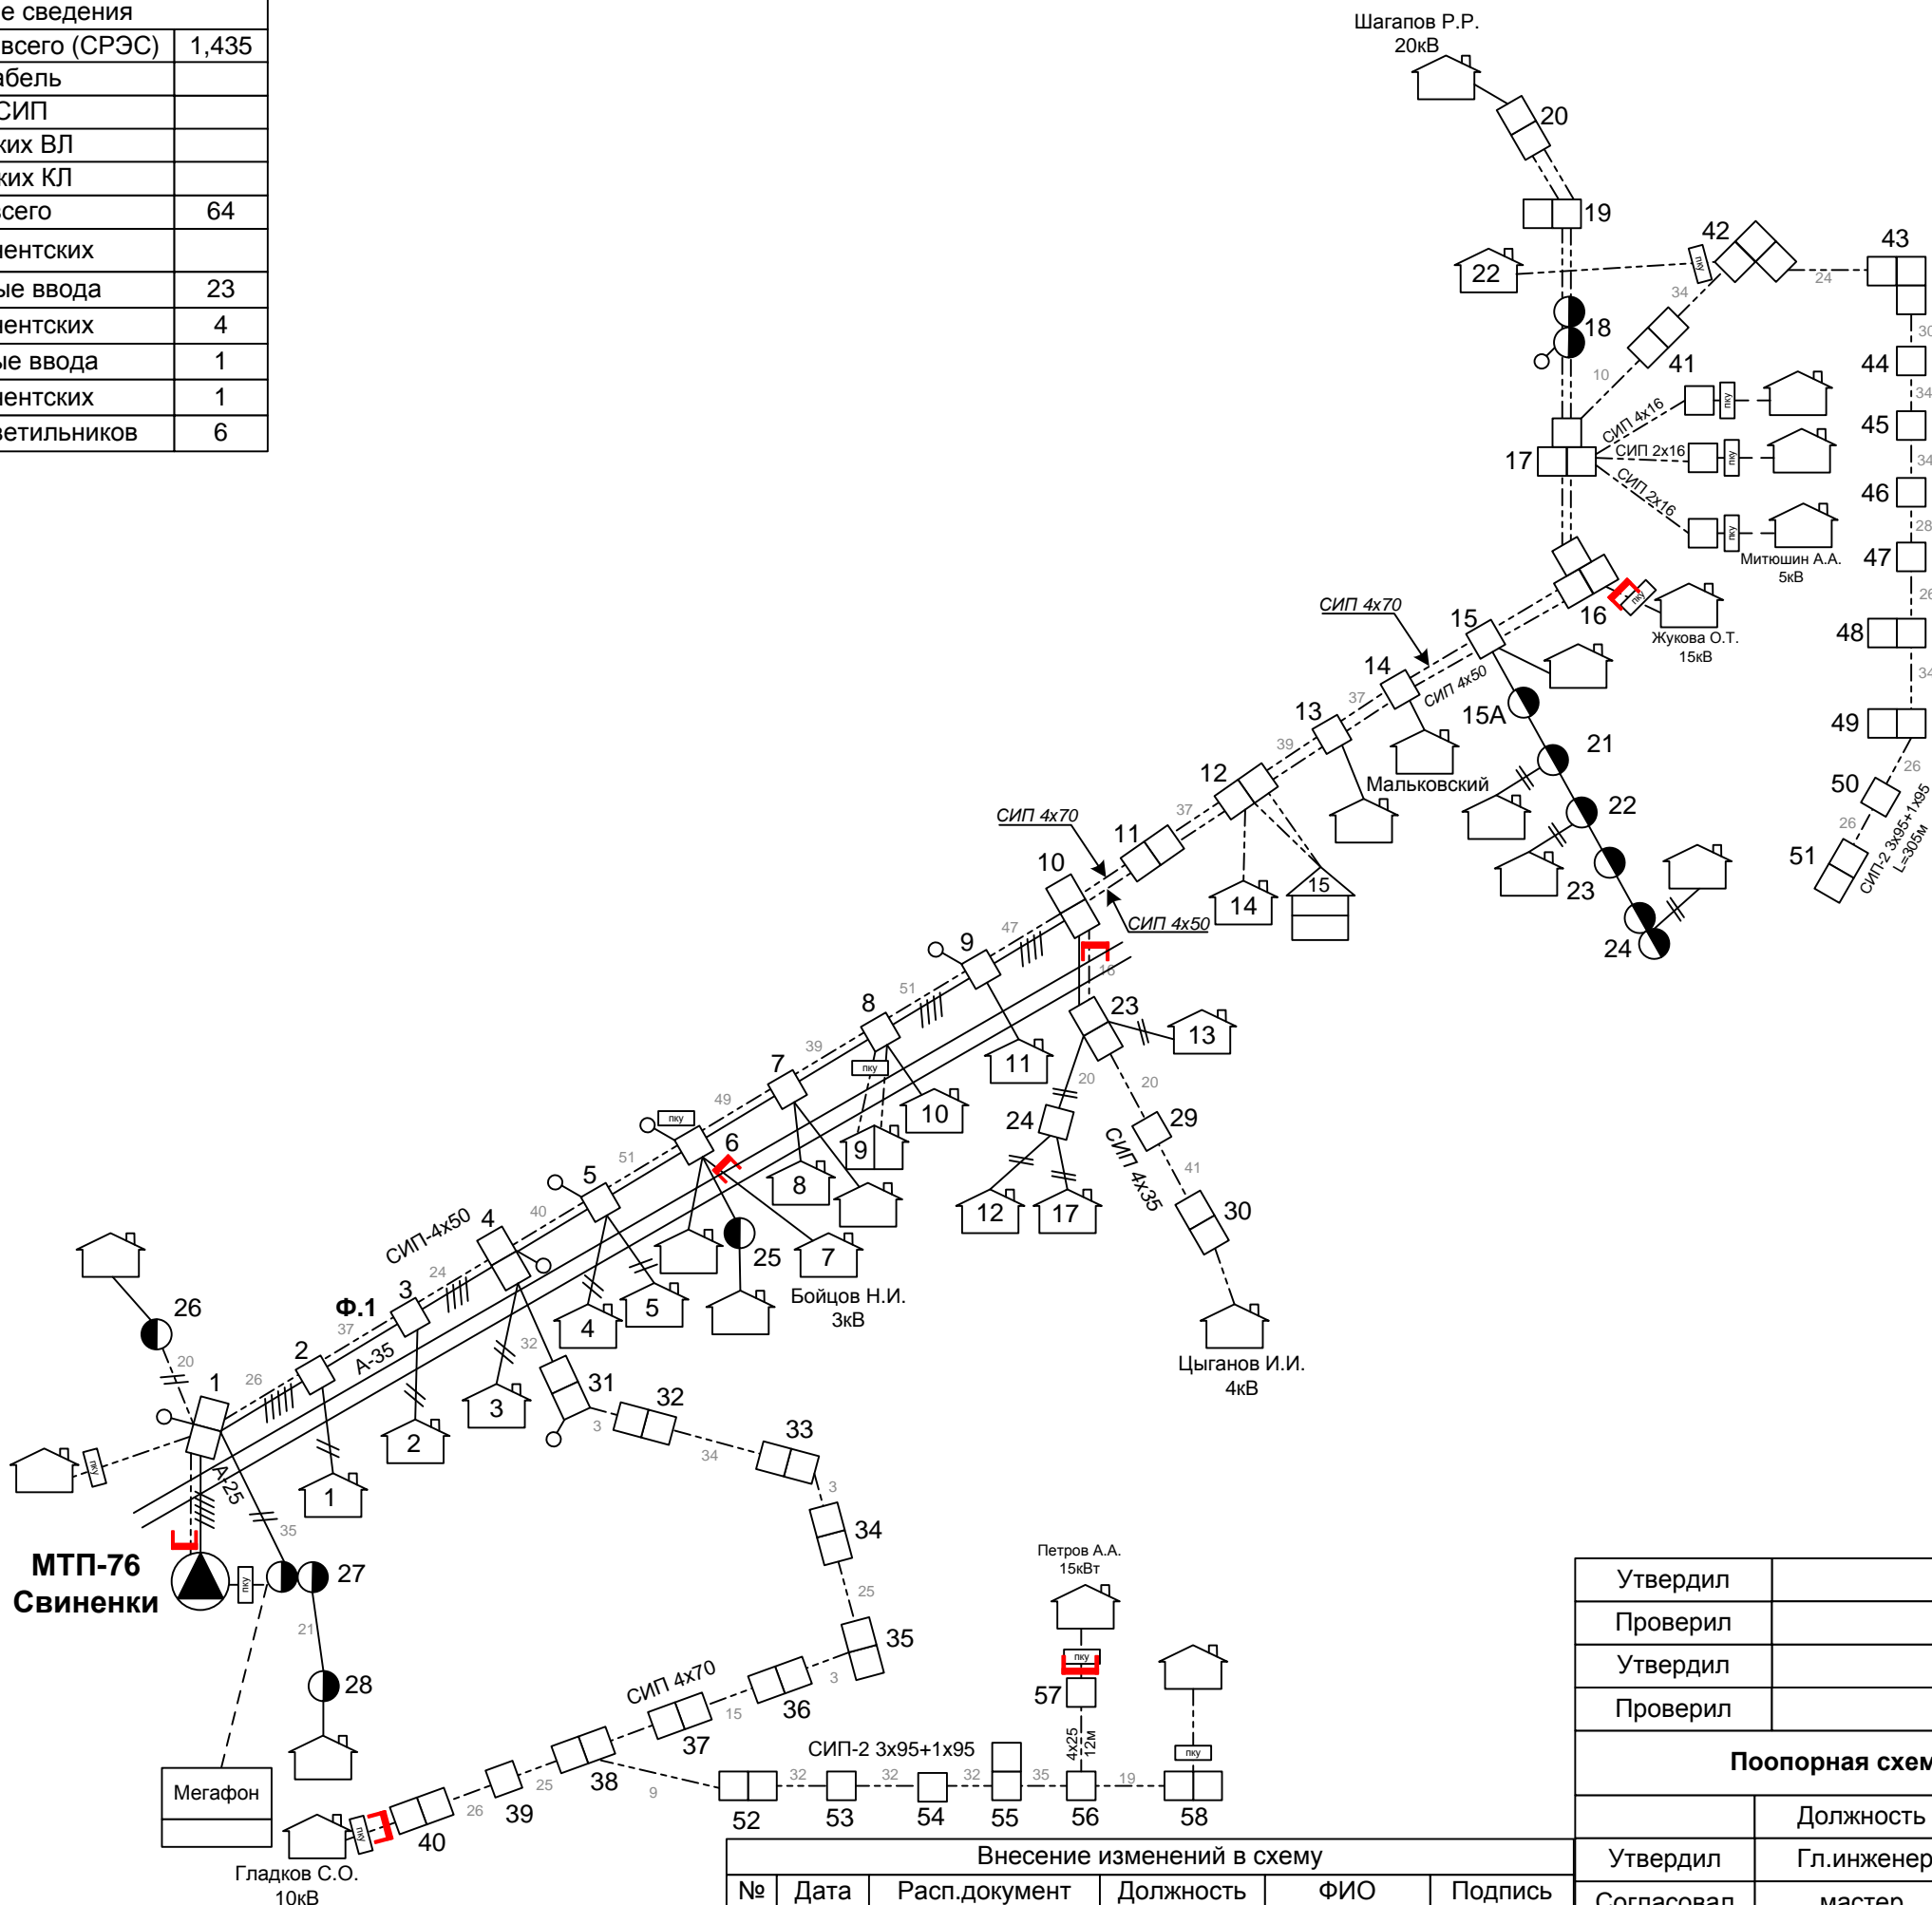

| Ведомость участков | | | |
|--------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| № | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля |
| 1 | Ф.1(МТП-оп.10) | 440 | А-35 |
| 2 | Ф.1(оп.10-11) | 43 | СИП 4x50 |
| 3 | Ф.1(оп.11-14) | 113 | А-35 |
| 4 | Ф.1(оп.15-18) | 120 | А-35 |
| 5 | Ф.1(оп.1-28, оп.1-26) | 120 | А-25 |
| 6 | Ф.1(МТП-оп.30) | 780 | СИП2А 3x50+54,6 |
| 7 | Оп.10-30 | 77 | СИП 4x35 |
| 8 | Оп. 38-58 | 159 | СИП-2 3x95+1x95 |
| 9 | Оп. 17-51 | 305 | СИП-2 3x95+1x95 |
| 10 | Ответвления к домам | 600 | А-16, А-25, СИП 2x16 |

| | | | | |
|--|------------|------------------|----------|---------|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-76 Свиненки СРЭС | | | | |
| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | Гл.инженер | Казаков С.В. | 22.06.15 | |
| Согласовал | мастер | Головленков А.Е. | 22.06.15 | |
| Проверил | | | | |
| Чертил | инженер | Буева М.С. | 22.06.15 | |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
