


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2,057
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,776
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	69
3	В т.ч. абонентских	9
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	2

Инв.№ 082-9932048

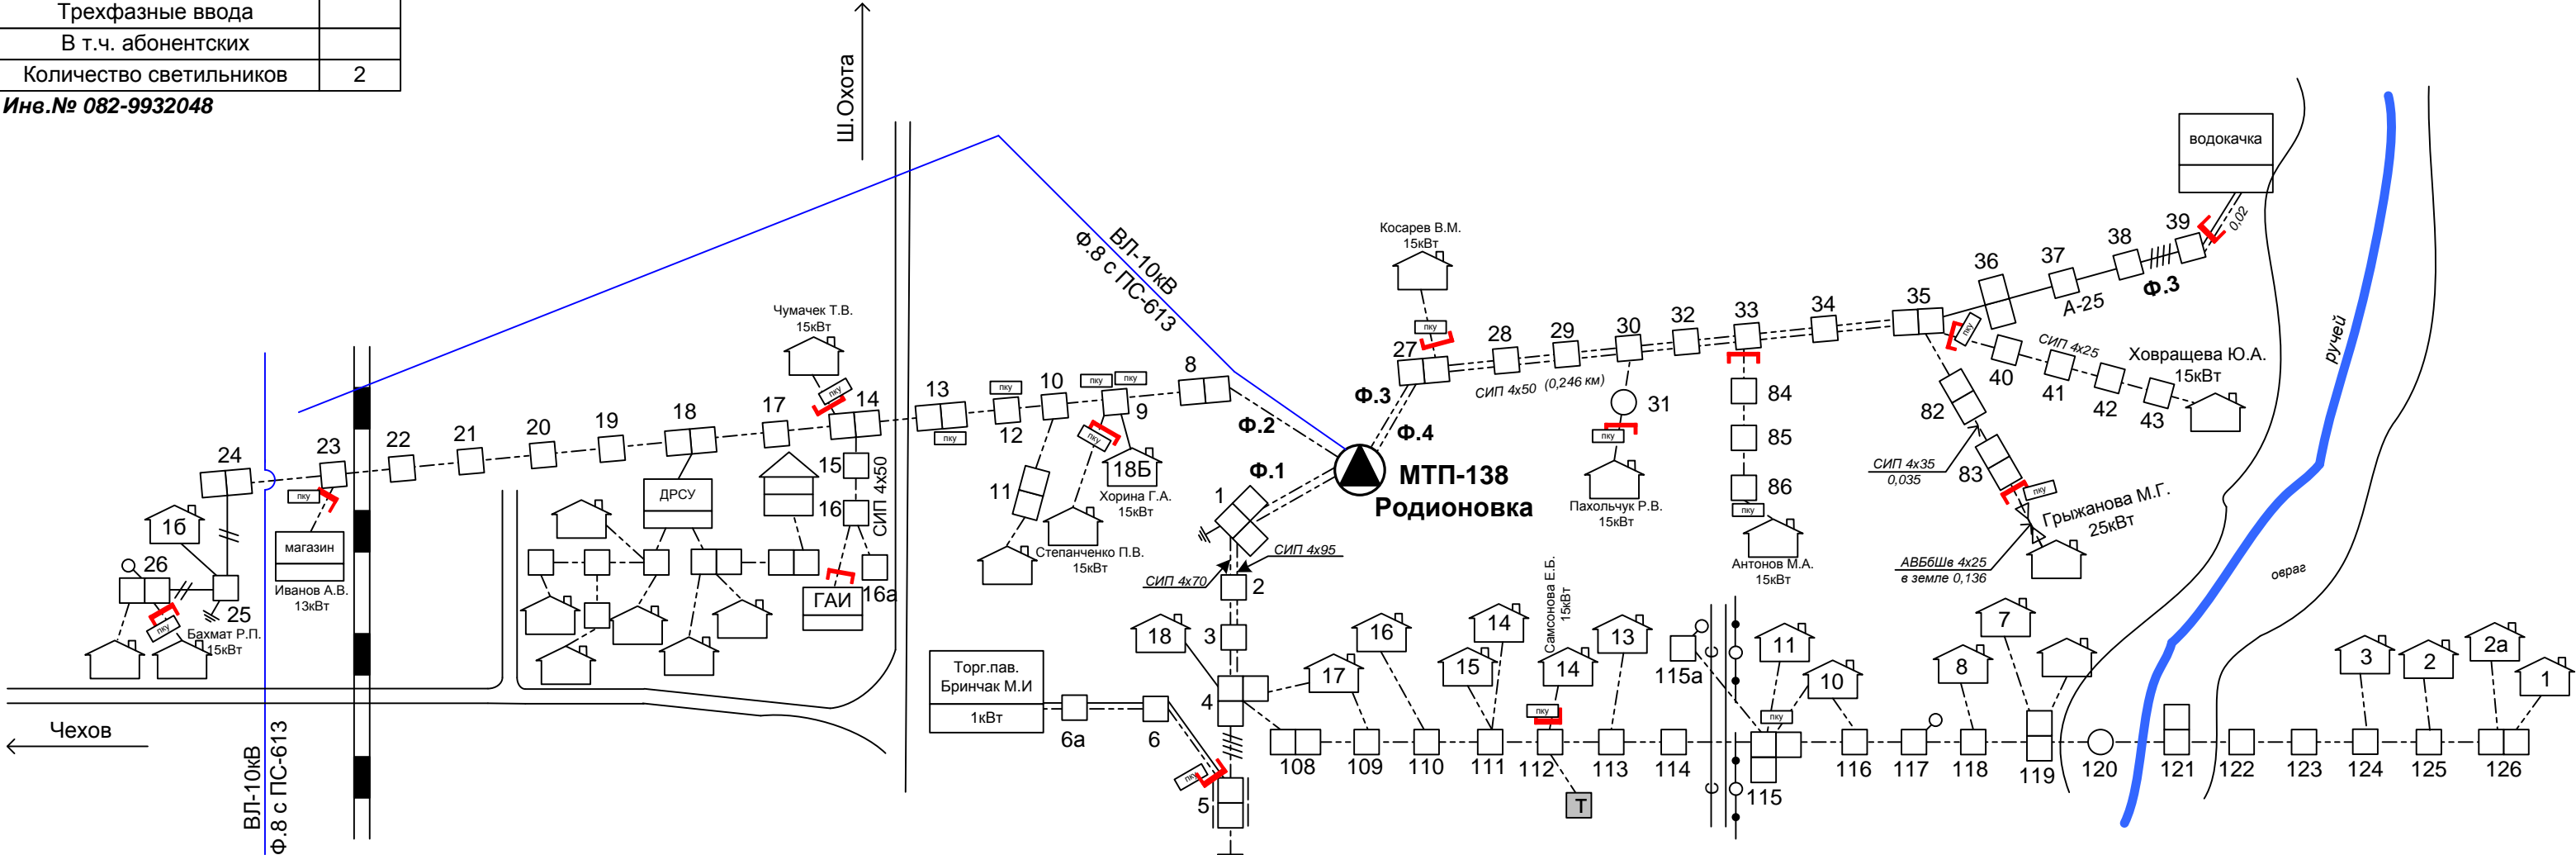

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.7)	123	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф.2 (МТП-оп.24)	512	СИП-2 3х95+1х95
3	Ф.1(МТП-оп.4)	172	СИП2А 3х70+1х70 (вторая цепь)
4	Ф.2 (оп.14-16)	96	СИП 4х50
5	Ф.1 (оп.4-126)	627	СИП-2 3х95+1х95
6	Ф.2(оп.24-26)	120	А-25
7	Ф.3(оп.35-39)	160	А-25
8	Ф.4 (МТП-оп.35)	246	СИП-4х50
9	Ответвления к домам		СИП 2х16, СИП 4х16, А-16

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-138 Родионовка СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	29.03.16	
Согласовал	мастер	Молодцов М.Г.	29.03.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	29.03.16	
