
Nº	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,474
1.1	В т.ч. кабель	0,110
1.2	В т.ч. СИП	0,364
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	13
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков					
Nº	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля		
1	Оп.1-13	364	СИП-2 3х95+1х95		
2					
3	Ответвления к домам				

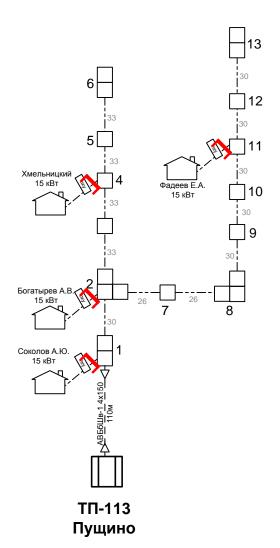

Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-113 д.Пущино СРЭС

L										
							Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Внесение изменений в схему				Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	17.06.15			
Nº	Дата	Расп.документ	Должность	ОИФ	Подпись	Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	17.06.15	
						Проверил				
						Чертил	Инженер	Буева М.С.	17.06.15	
