


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,343
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,343
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	43
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(БМКТП-оп.5 )	105	СИП 3х95+1х95
2	Ф.1 (оп. 5-23)	518	СИП 3х95+1х95
3	Ф.2 (оп. 5-43)	552	СИП 3х95+1х95
4	Ответвления к домам		

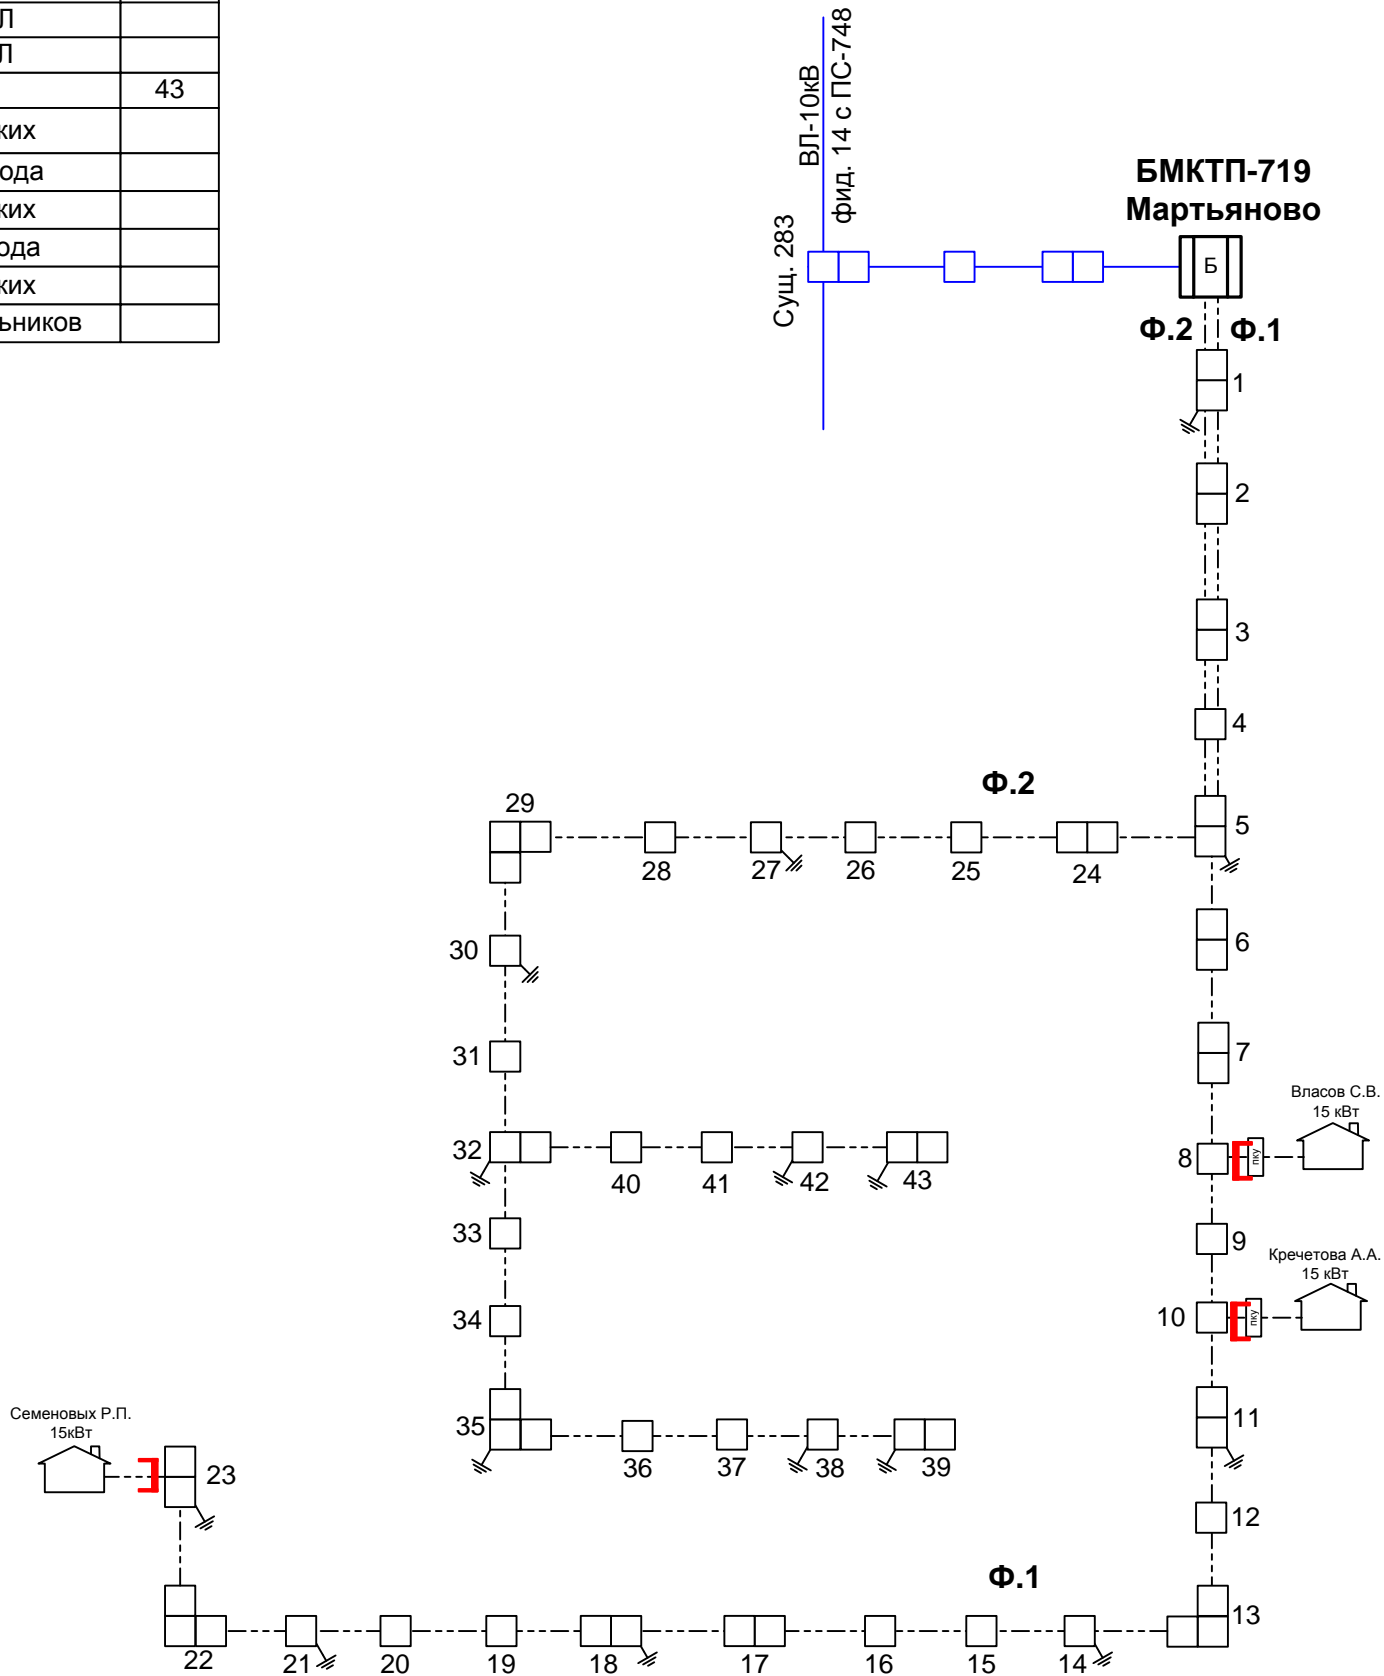

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-719 д.Мартьяново СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	24.06.14	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	24.06.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	24.06.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	24.06.14	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
