




| № | Общие сведения | |
|-----|--------------------------------|------|
| 1 | Протяженность всего(СРЭС) | 1391 |
| 1.1 | В т.ч. кабель | |
| 1.2 | В т.ч. СИП | 1391 |
| 1.3 | В т.ч. абоненских ВЛ | |
| 1.4 | В т.ч. абоненских КЛ | |
| 2 | Опор всего | 71 |
| 3 | кол-во линейных разъединителей | |
| 4 | Однофазные вводы | 37 |
| 5 | В т.ч. абонентских | |
| 6 | Трехфазные вводы | 3 |
| 7 | В т.ч. абонентских | |
| 8 | Количество светильников | 1 |


 Опора ж/б одност.

 Опора ж/б двухст.

 Граница балансовой принадлежности

КТП-315 п. Большевик ул. Карпова

| Ведомость участков | | | |
|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| № | Участок, № опор | длина км | марка провода, кабеля |
| 1 | Ф.1(КТП-оп.7,27-39) | 573 | СИП 2А 3×70+1×70+1×25 |
| 2 | Ф.1(оп.2-оп.5/03) | 70 | СИП 4х35 |
| 3 | Ф.2(КТП-оп.26) | 748 | СИП 2А 3×70+1×70+1×25 |

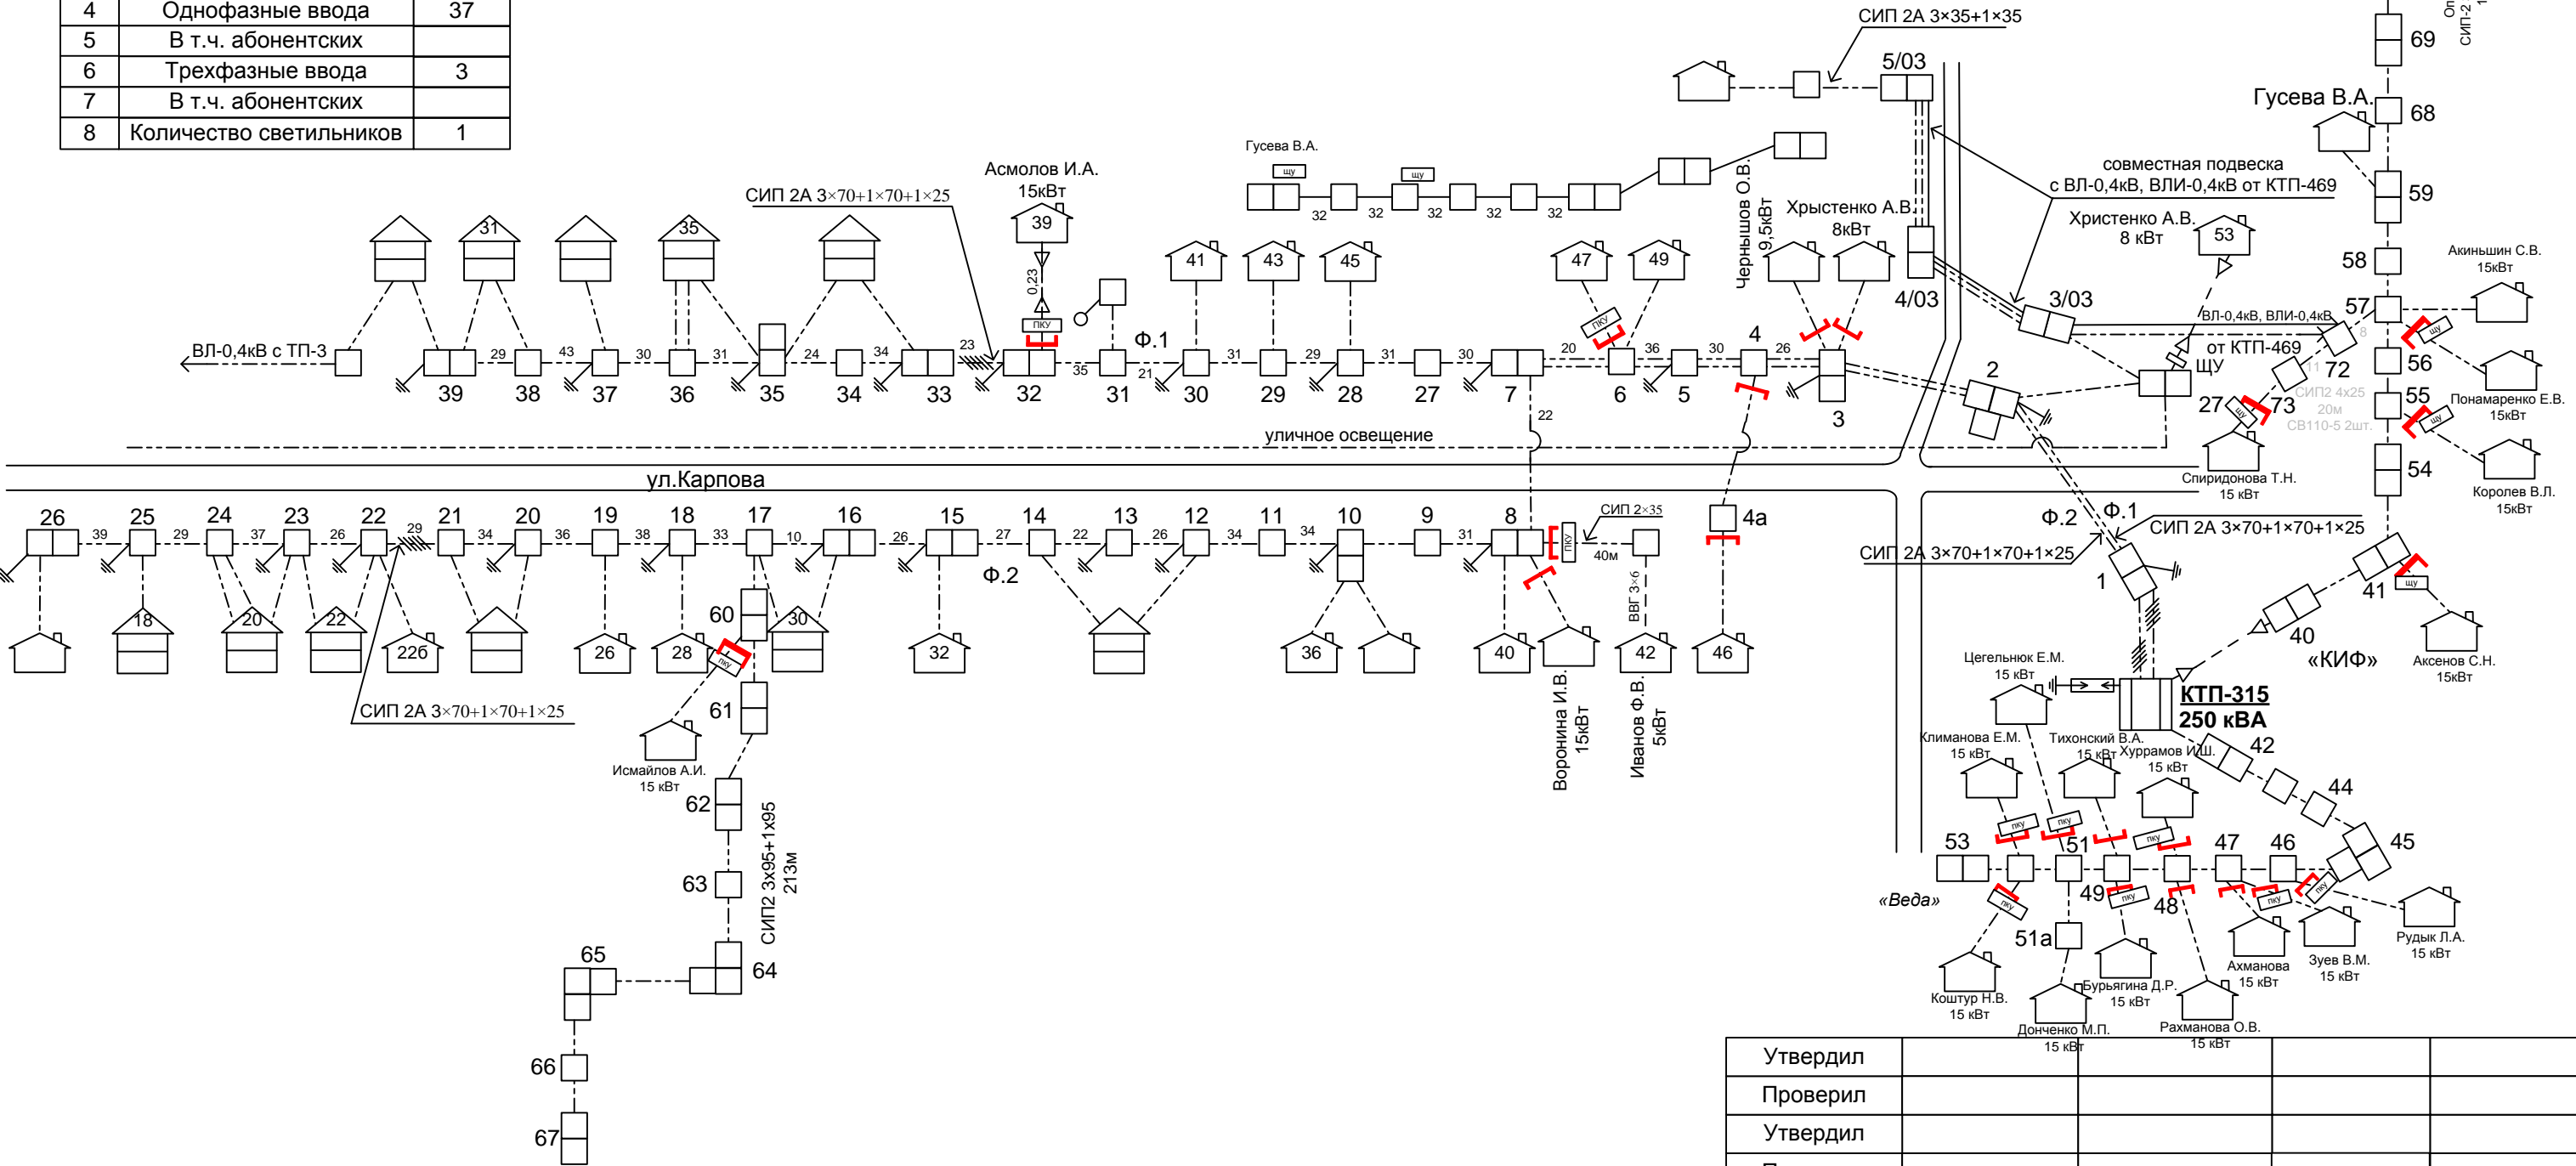

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |

Поопорная схема ВЛ-0,4кВ от КТП-315 п.Большевик ул. Карпова

| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
|------------|------------|--------------|----------|---------|
| Утвердил | Гл.инженер | Казаков С.В. | 12.05.15 | |
| Согласовал | мастер | Иванов Ю.М. | 12.05.15 | |
| Проверил | | | | |
| Чертил | инженер | Буева М.С. | 12.05.15 | |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
