
Nº	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	900
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	480
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	34
3	В т.ч. абонентских	12
4	Однофазные ввода	23
5	В т.ч. абонентских	5
6	Трехфазные ввода	2
7	В т.ч. абонентских	2
8	Количество светильников	

Ведомость участков						
Nº	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля			
1	Ф.1(МТП-оп.23)	800	СИП 2A 3x70+1x70+1x16			
2	Ф.1(оп.1-27; 1-24)	160	A-35			
3	Ф.1(оп.12-34)	280	A-50			
4	Ответвления к домам	920	А-16,А-25,СИП2х16			

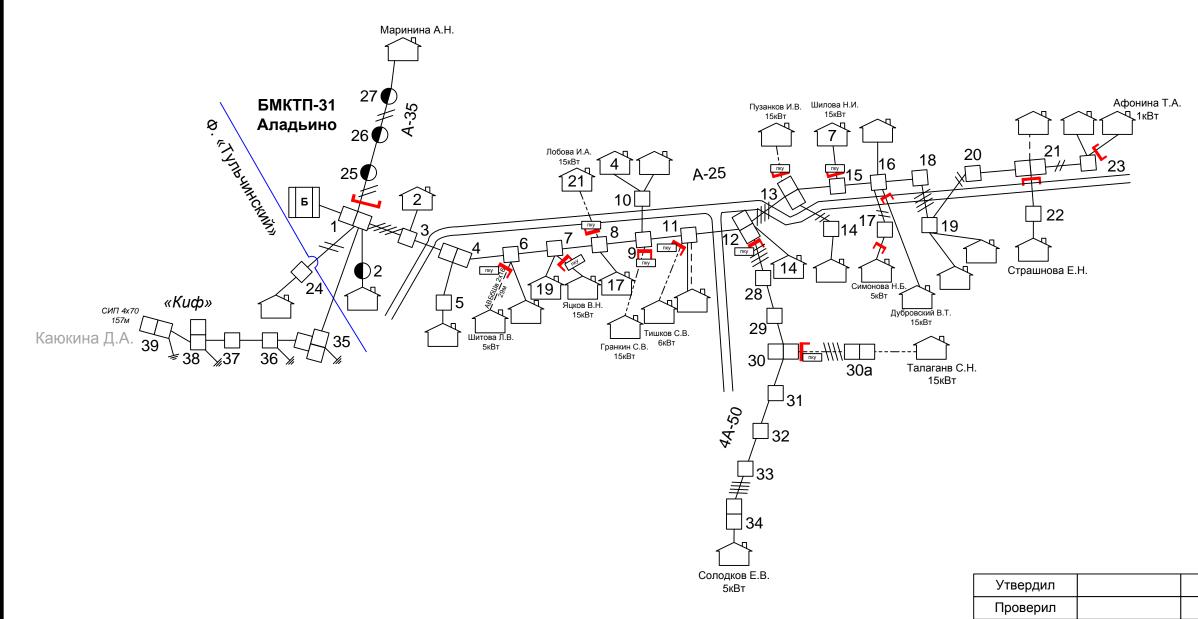

Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-31 Аладьино СРЭС

							Должность	Фимилия И.О.	Дата	Подпись
Внесение изменений в схему			Утвердил	И.о.зам.гл.инж.	Лапко И.Н.					
Nº	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись	Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
						Проверил	Вед.инженер	Лапко И.Н.		
						Чертил	техник	Хромова М.Ю.		
