
Nº	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,064
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	1,064
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	36
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Ведомость участков					
Nº	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля		
1	БМКТП-оп.1-36	172	СИП-2 3х95+1х95		
2	БМКТП-оп.2-3-14	382	СИП-2 3х95+1х95		
3	Оп.3-20-31	510	СИП-2 3х95+1х95		
4	Ответвления к домам				

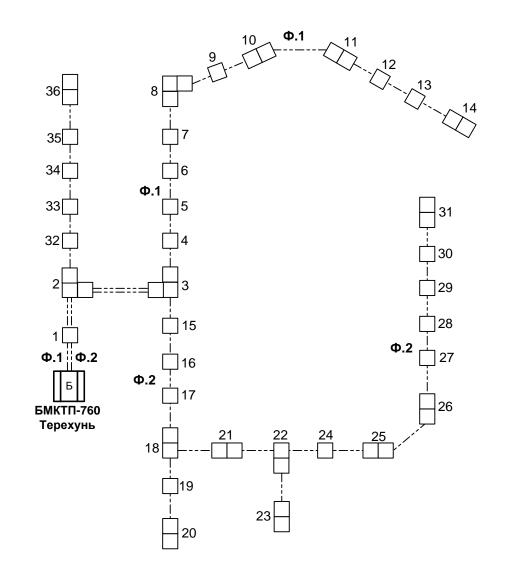

Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		

Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с БМКТП-760 Терехунь СРЭС

							Должность	Фамилия И.О.	дата	Подпись
Внесение изменений в схему				Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	18.03.16			
Nº	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись	Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	18.03.16	
						Проверил		<u> </u>		
						Чертил	инженер	Буева М.С.	18.03.16	
