


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,87
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,39
1.3	абонентских ВЛ	0,88
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор СРЭС	25
3	Опор абонентских	12
4	Однофазные ввода	39
5	В т.ч. абонентских	4
6	Трехфазные ввода	5
7	В т.ч. абонентских	5
8	Количество светильников	6

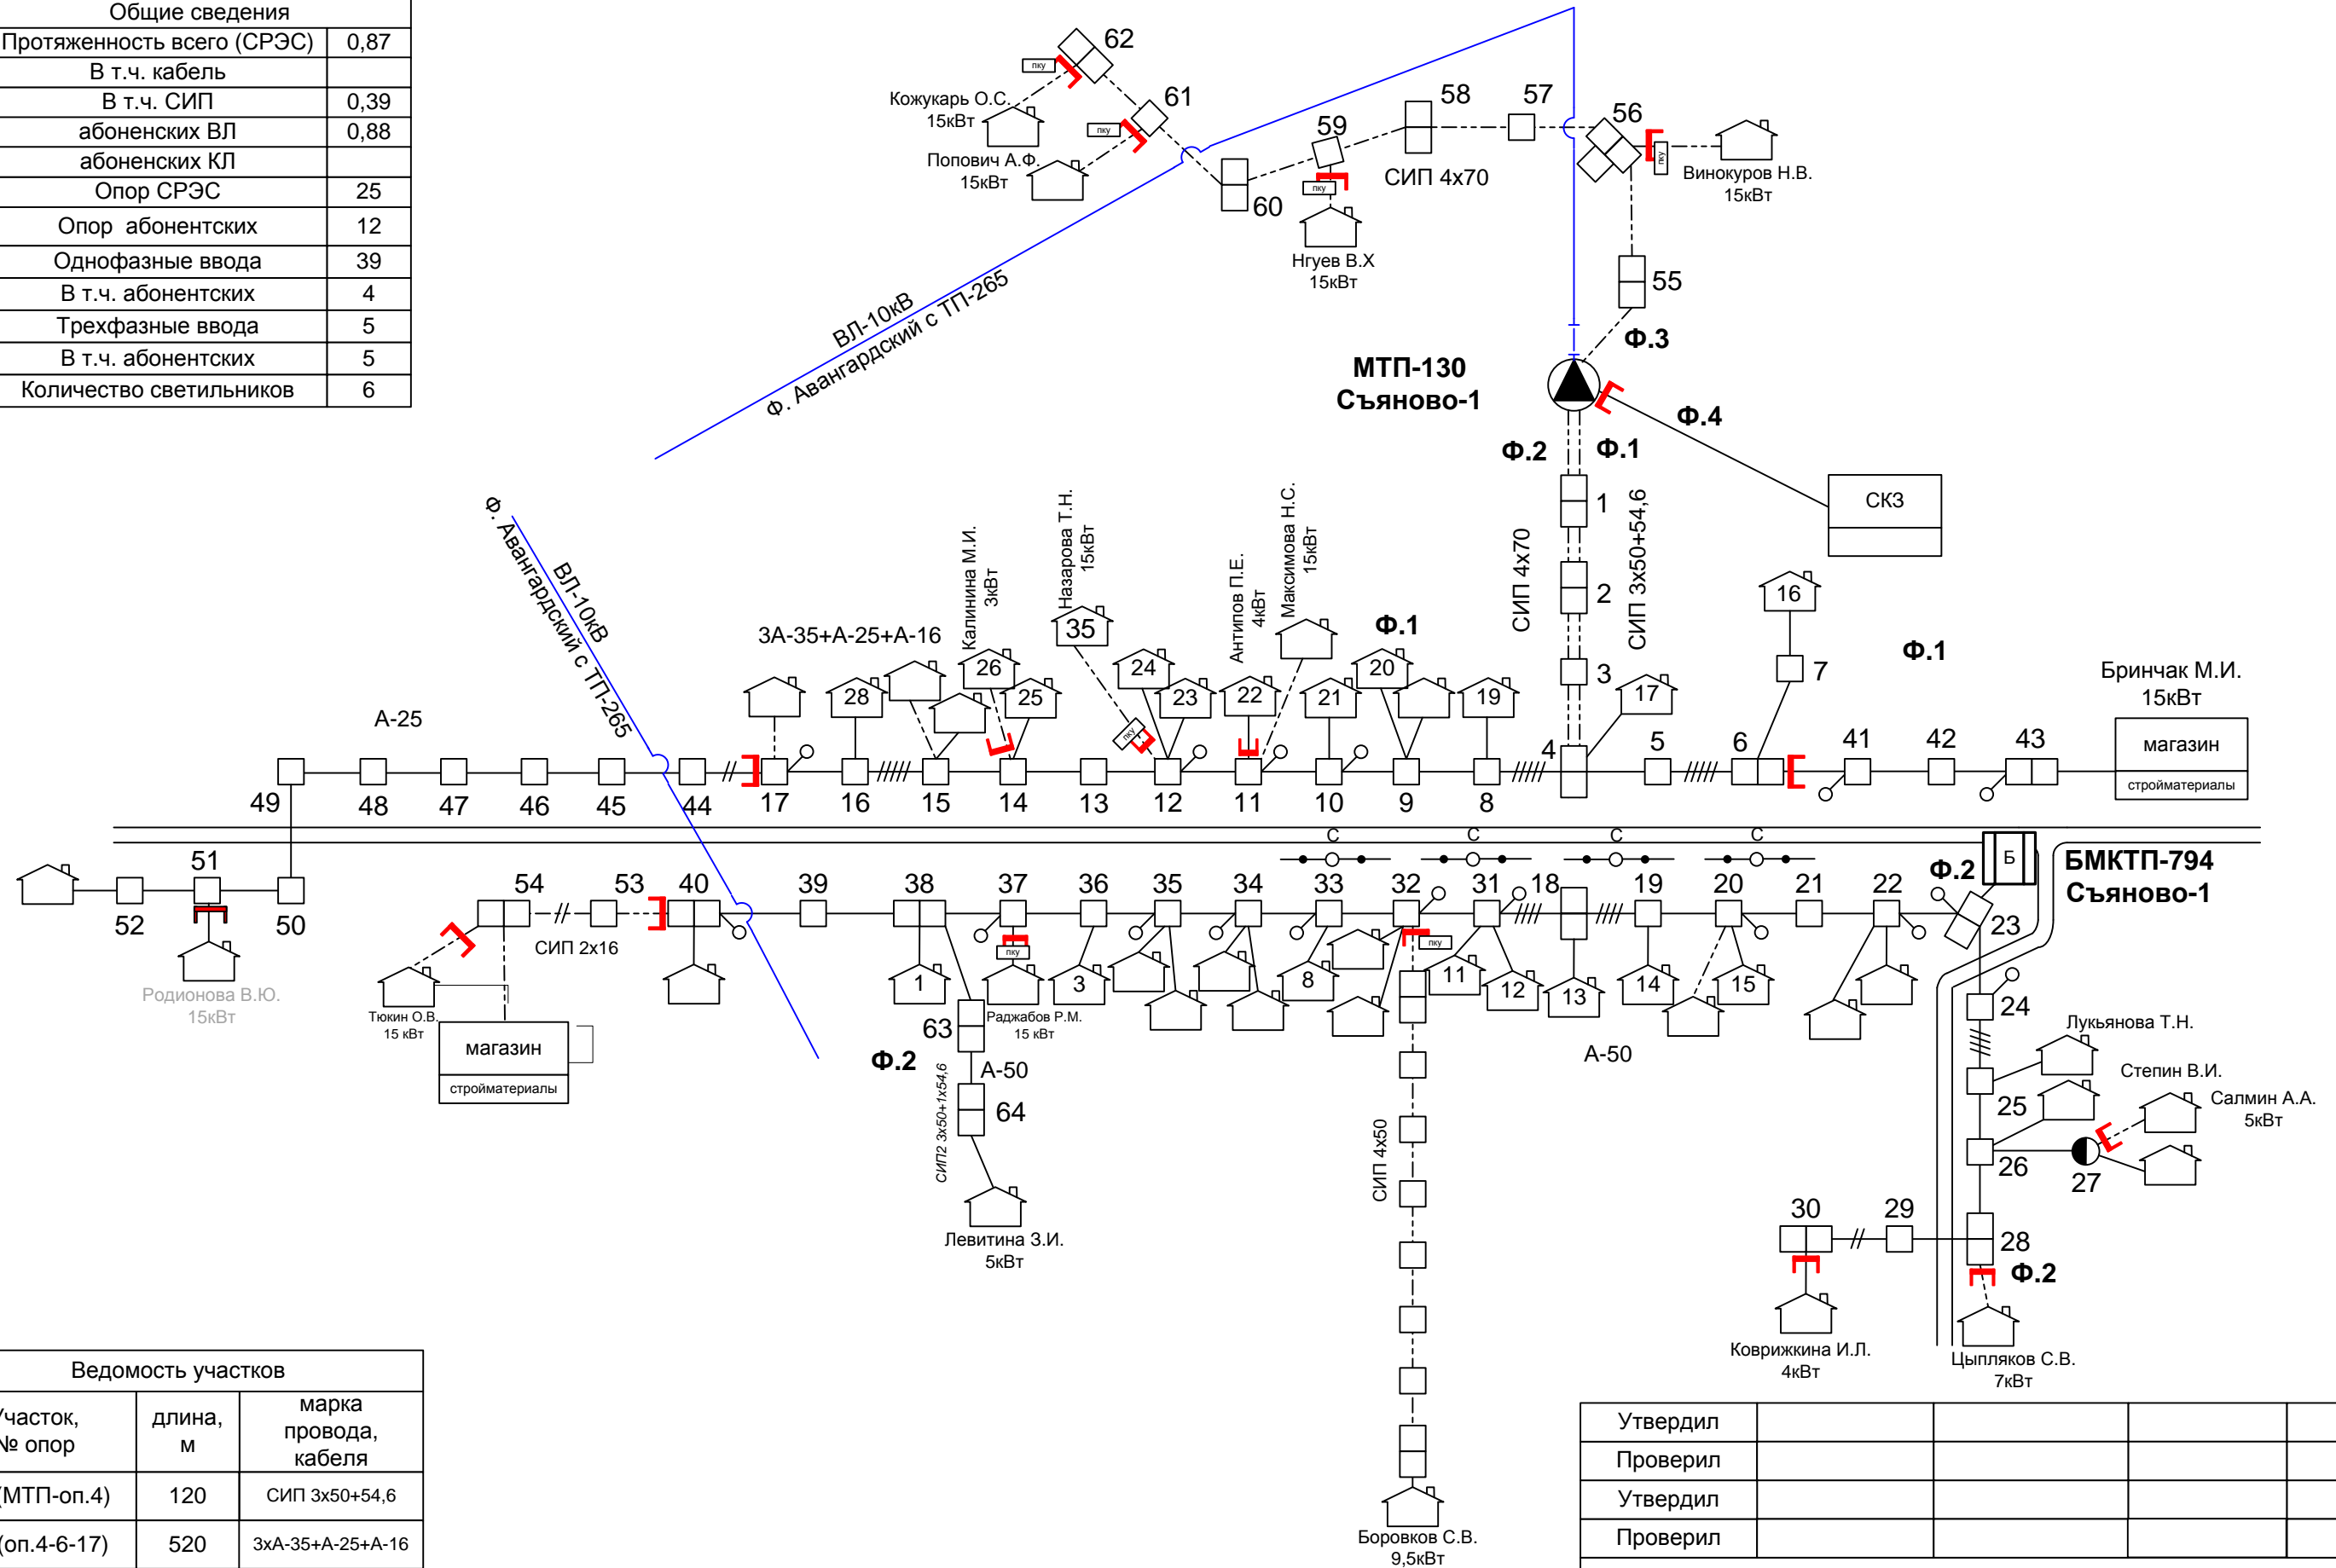

Ведомость участков		
Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
Ф.1(МТП-оп.4)	120	СИП 3х50+54,6
Ф.1(оп.4-6-17)	520	3хА-35+А-25+А-16
Ф.2(МТП-оп.18)	160	СИП 3х50+54,6
Ф.2(оп.18-28-40)	800	А-50
Ф.2(оп.28-30)	80	А-25
Ф.3(МТП-оп.62)	232	СИП2 4х95
Ответвления к домам	700	А-25; СИП 4х16; СИП 2х16

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-130 Съяново-1 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	12.05.15	
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.	12.05.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Бучева М.С.	12.05.15	
