


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2,252
1.1	В т.ч. кабель, км	0,291
1.2	В т.ч. СИП, км	1,961
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	61
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Оп.1-30	461	СИП-2 3х95+1х95
2	Оп.15-49	315	СИП-2 3х95+1х95
3	Оп.22-40	315	СИП-2 3х95+1х95
4	Оп.23-58	310	СИП-2 3х95+1х95
5	Оп.15-19	140	СИП-2 3х95+1х95
6	Оп.4-54	420	СИП-2 3х95+1х95
7	КТП-ШК-1	96	АВБбШв 4х95
8	ШК-1-ШК-2	170	АВБбШв 4х95
9	ШК-2-ШК-3	25	АВБбШв 4х95
10	Ответвления к домам		

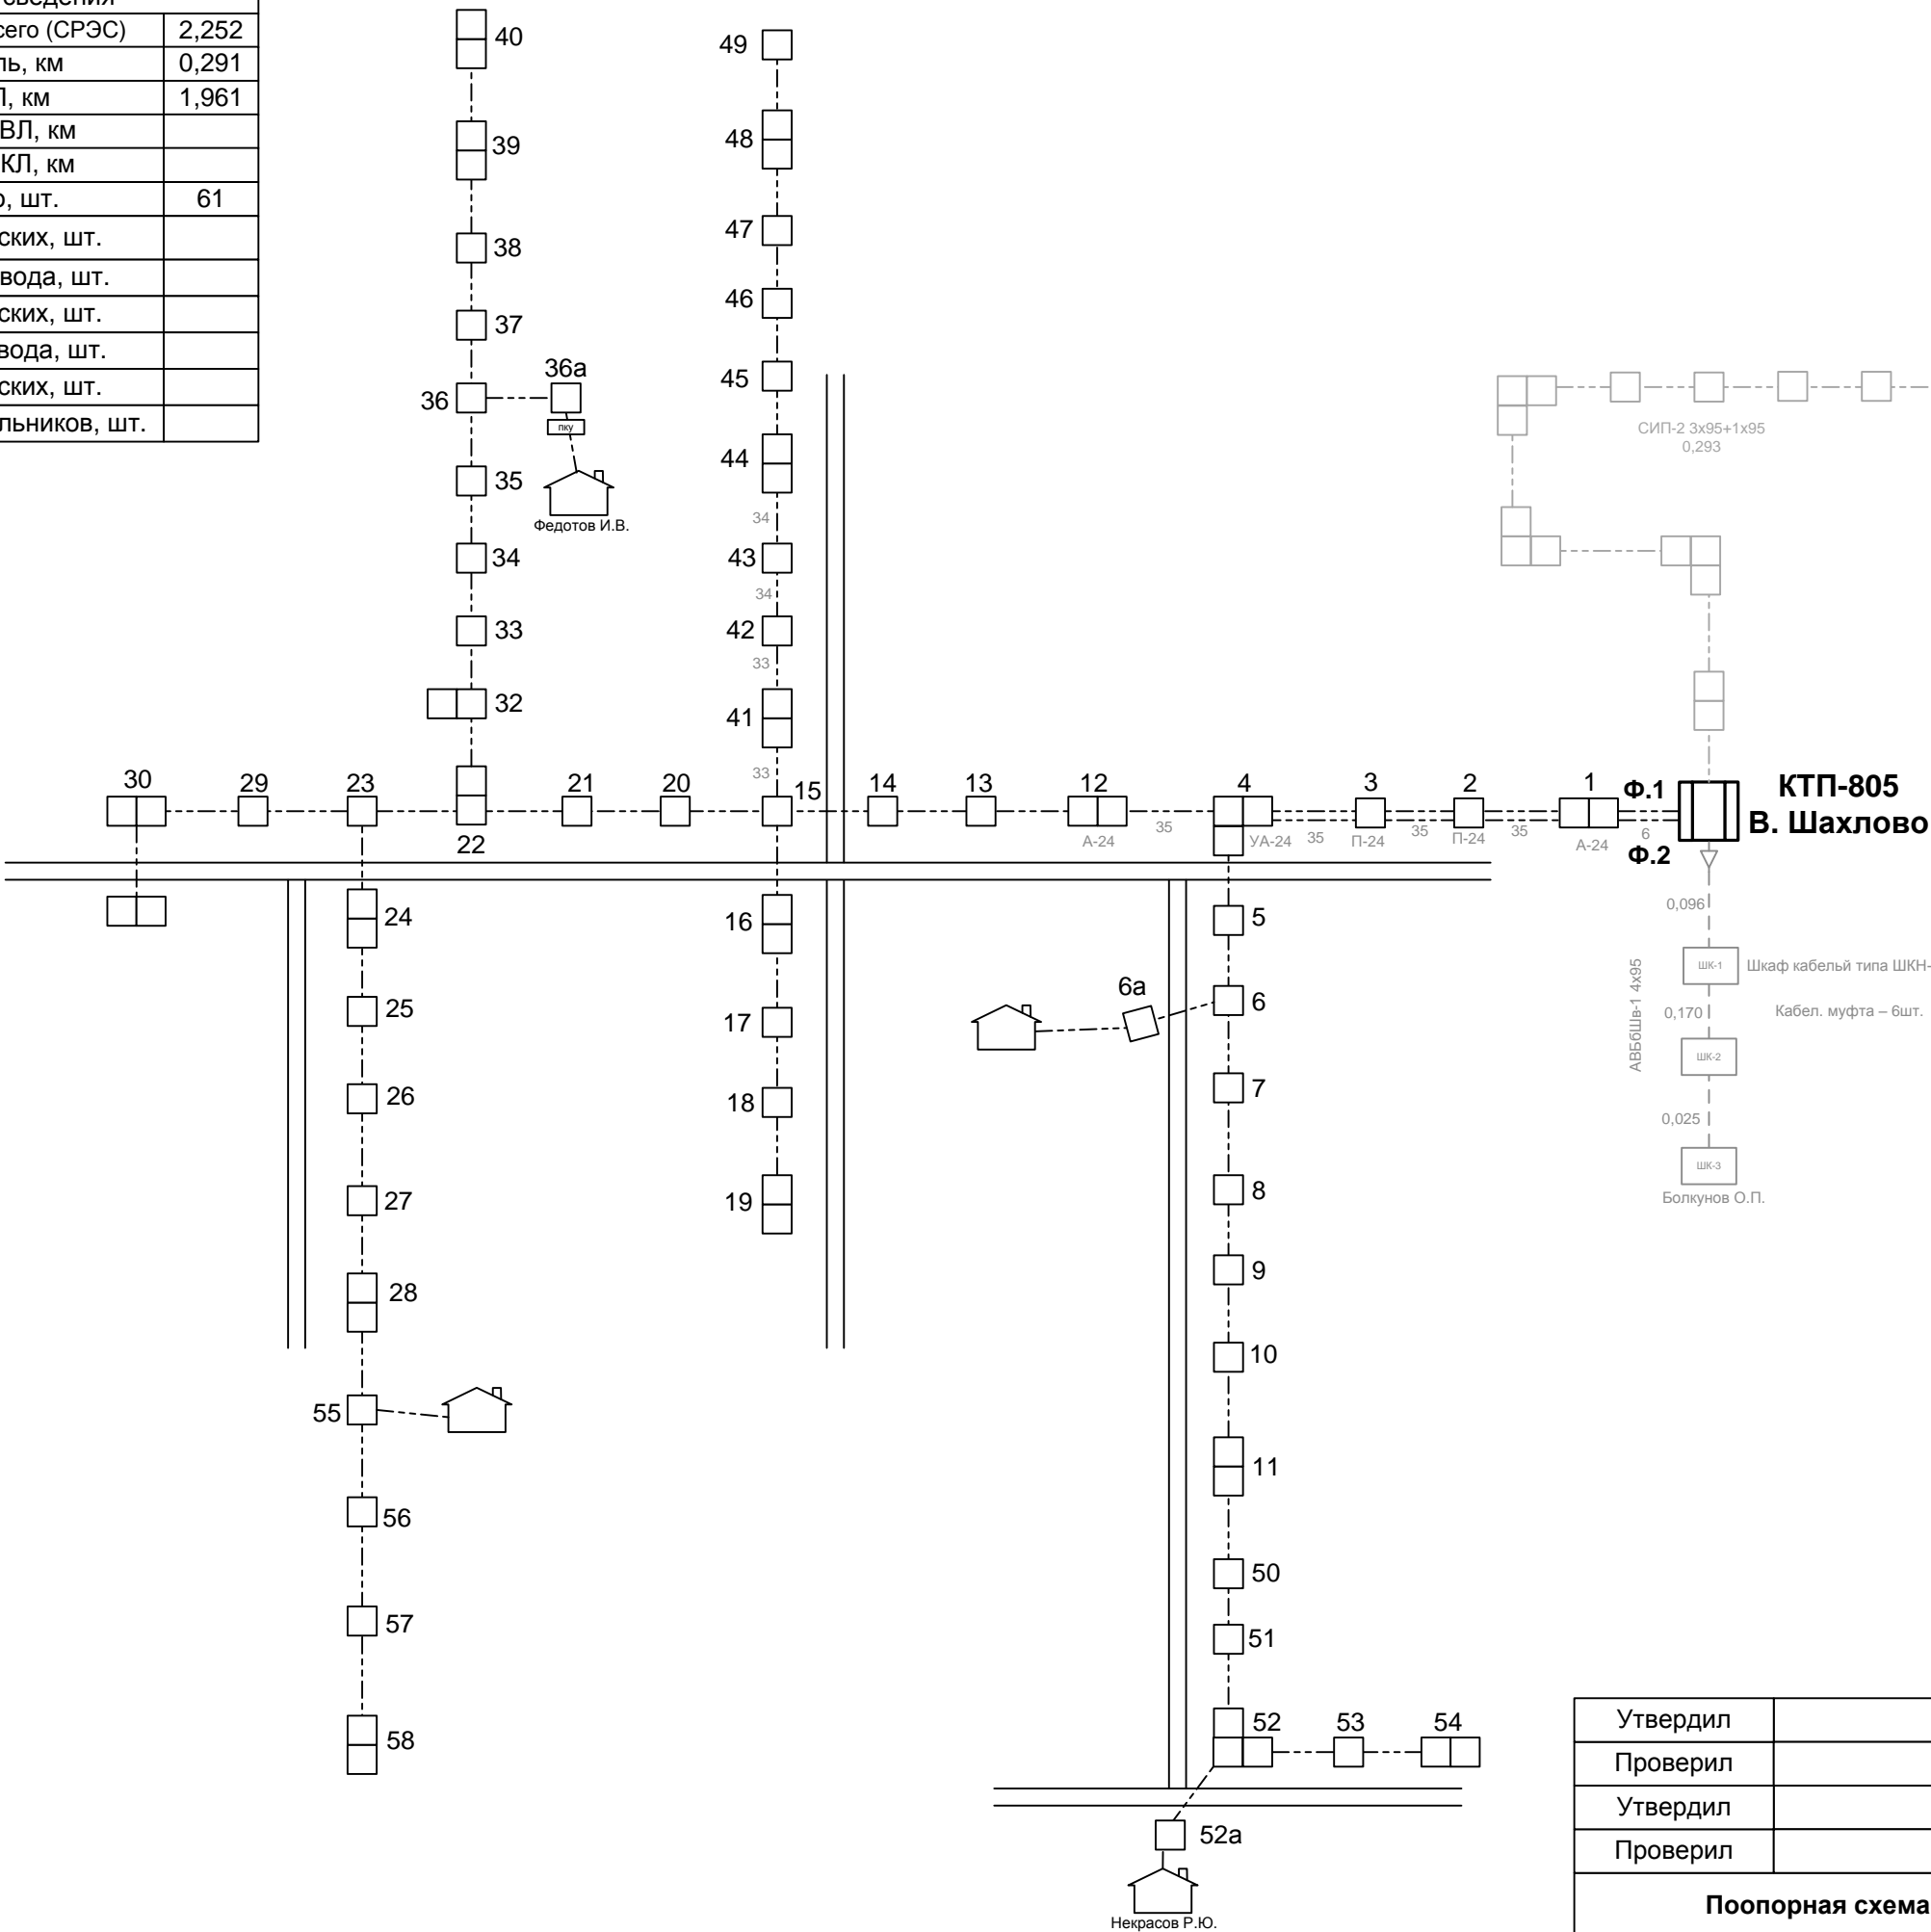

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с КТП-805 д.В. Шахлово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	29.04.15	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	29.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	29.04.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
