
Nº	Общие сведения			
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,476		
1.1	В т.ч. кабель			
1.2	В т.ч. СИП	0,476		
1.3	абоненских ВЛ			
1.4	абоненских КЛ			
2	Опор всего			
3	В т.ч. абонентских			
4	Однофазные ввода			
5	В т.ч. абонентских			
6	Трехфазные ввода			
7	В т.ч. абонентских			
8	Количество светильников			

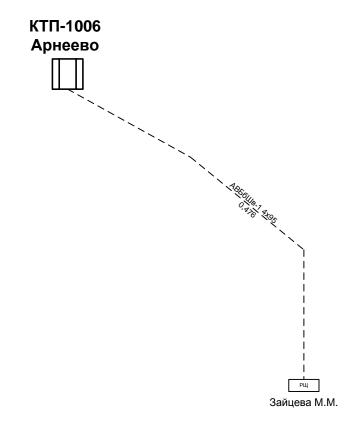

Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		

## Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-1006 Арнеево СРЭС

							Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Внесение изменений в схему				Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.				
Nº	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись	Согласовал	мастер	Головленков А.Е.		
						Проверил	•			
						Проверия				
						Чертил	инженер	Буева М.С.		

	Ведомость участков						
Nº	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля				
1	Ф.1(МТП-оп.5)	146	СИП2 3х95+1х95				
4	Ответвления к домам	140	СИП 2х16, СИП 4х16				
