


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1260
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	580
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	47
3	В т.ч. абонентских	15
4	Однофазные ввода	18
5	В т.ч. абонентских	1
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	1

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.5)	180	3А-35+А-25
2	Ф.1 (оп.5-9-22)	400	4А-50+А-25
3	Ф.1(оп.9-16-32)	400	А-25
4	Ф.1(оп.7-29)	240	А-25
5	Ответвления к домам	360	А-16,А-25,СИП2х16

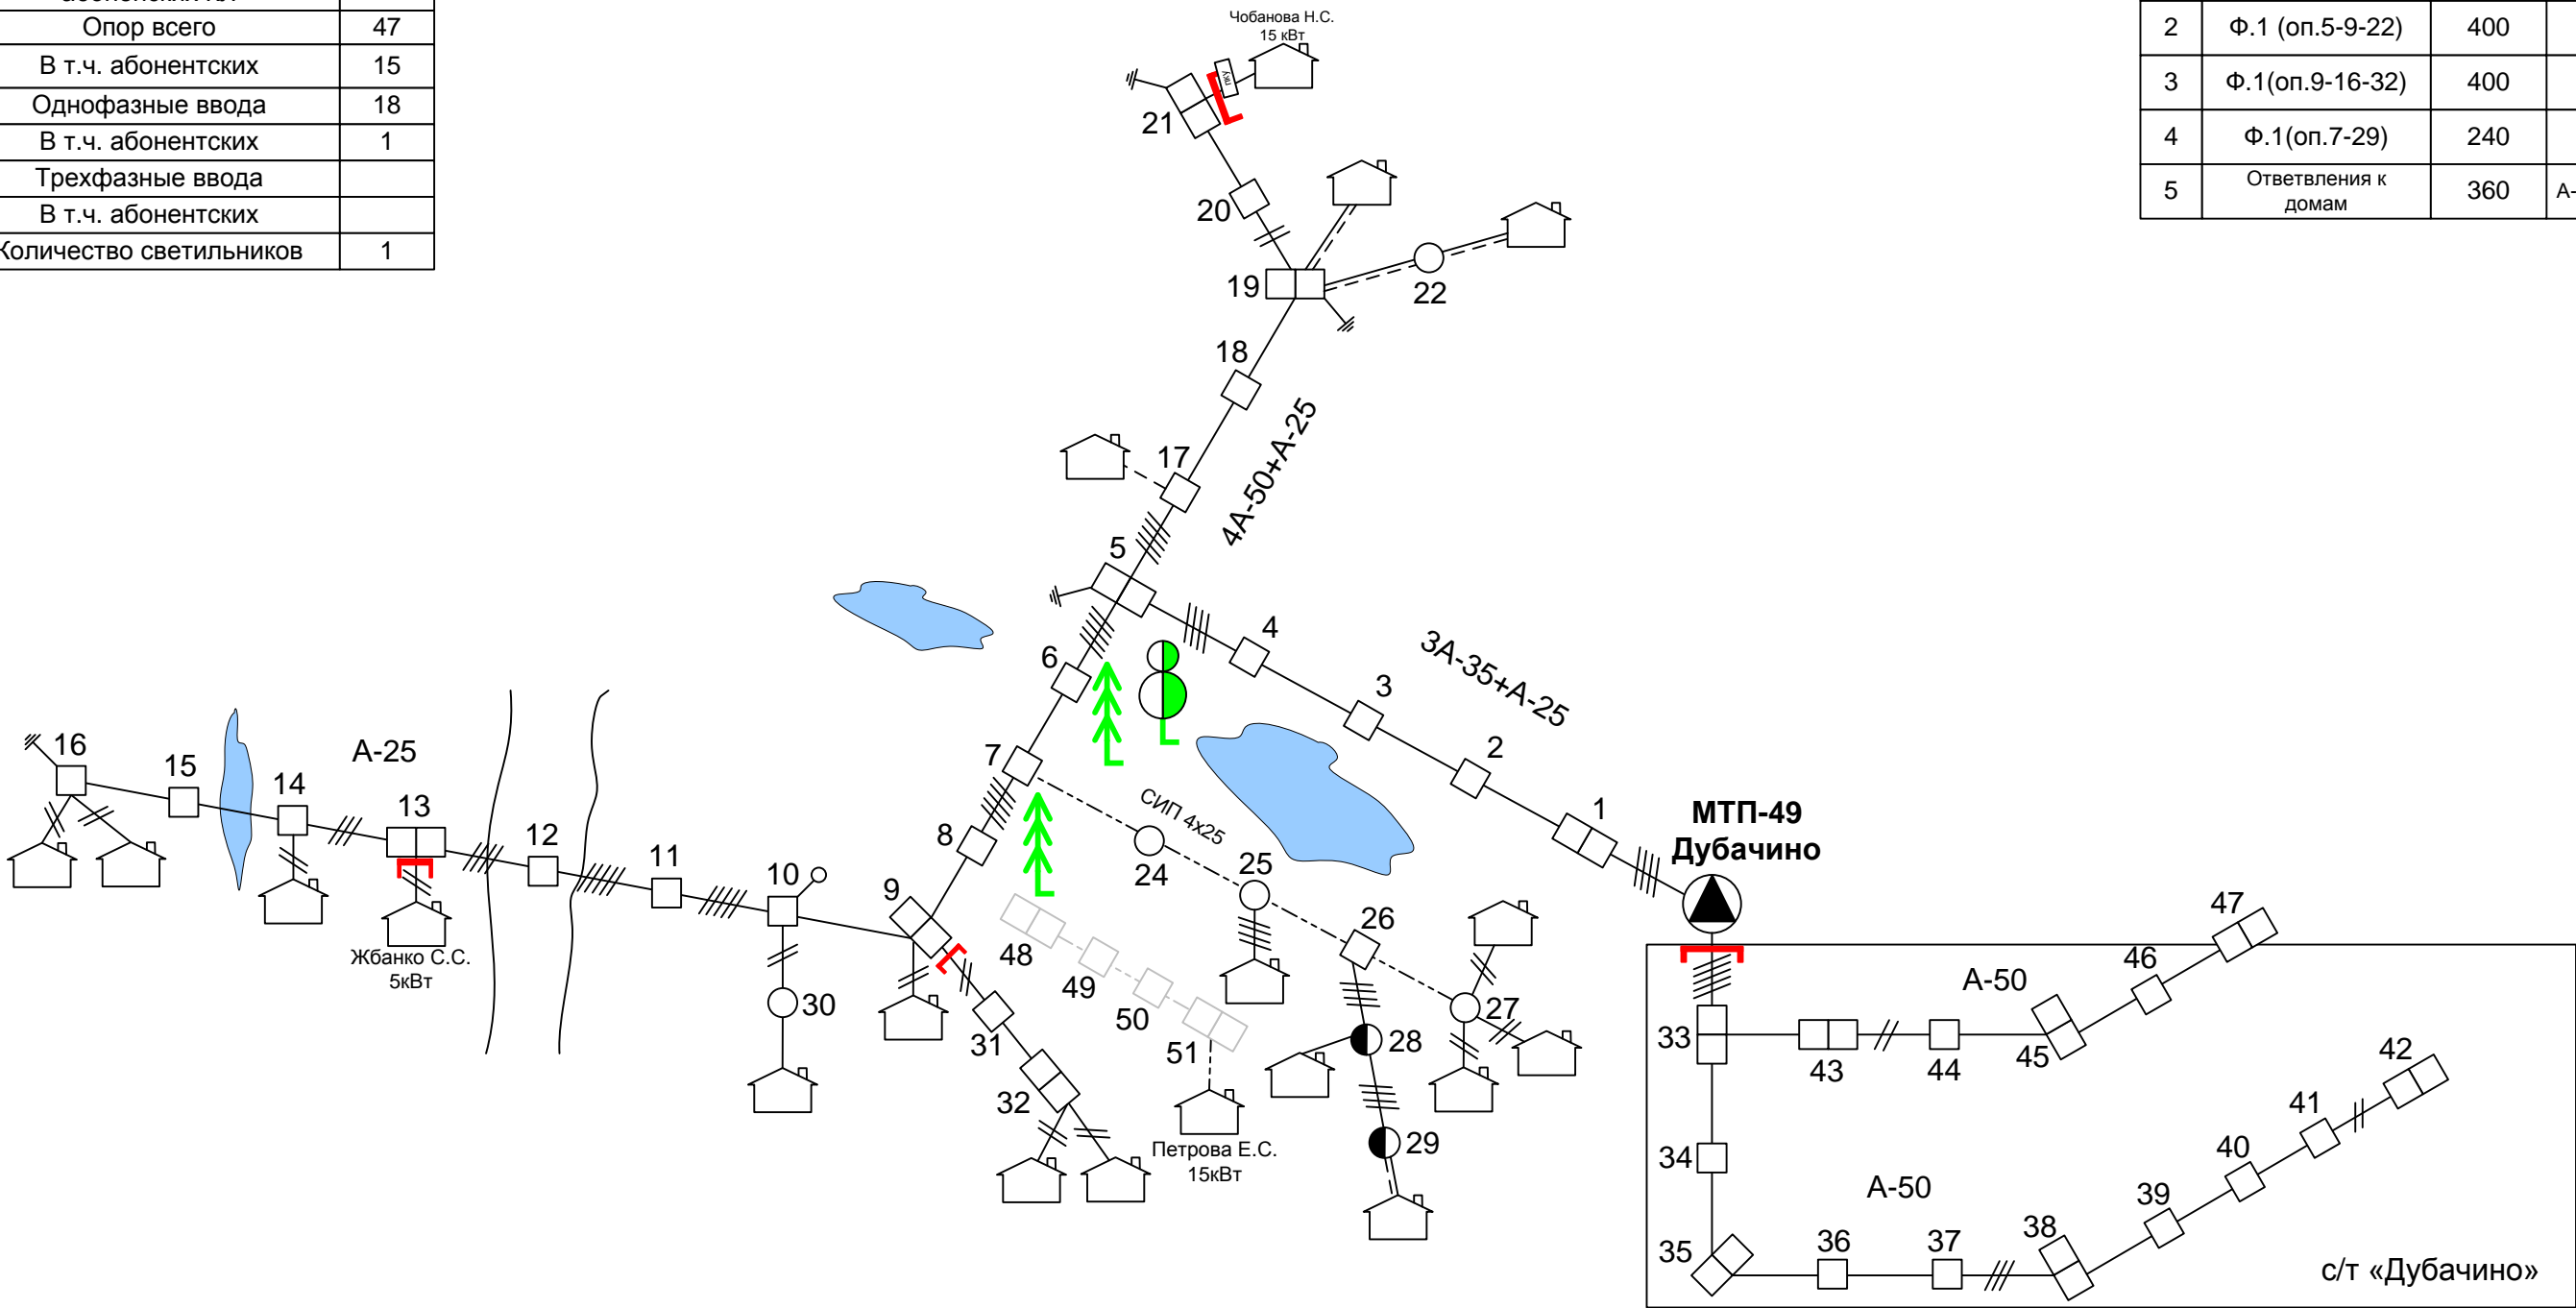

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-49 Дубачино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	И.о.зам.гл.инж	Лапко И.Н.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Вед.инженер	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

