

Nº	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,860
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,860
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	28
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	·
8	Количество светильников	·
9		

Ведомость участков						
Nº	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля			
1	Ф.1 (БМКТП-оп.28)	690	СИП2 3х95+1х95			
2	Оп.16-21	170	СИП2 3х95+1х95			
3	Ответвления к домам					



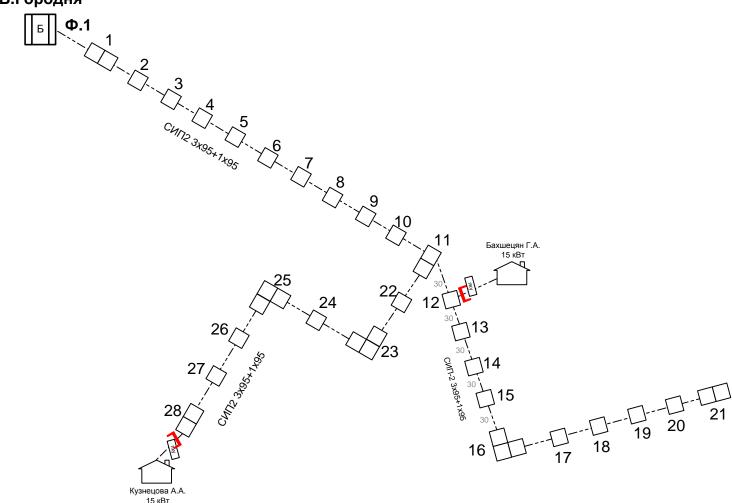

Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-850 Б.Городня СРЭС

							Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Внесение изменений в схему				Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	16.02.15			
Nº	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись	Согласовал	мастер	Рожков В.М.	16.02.15	
						Проверил	Инженер	Хромова М.Ю.	16.02.15	
						Чертил	Инженер	Буева М.С.	16.02.15	
