


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),м	1200
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор СРЭС, шт	31
3	Опор абонентских, шт	
4	Однофазные ввода	4
5	В т.ч. абонентских	4
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.21)	800	А-25
2	Ф.2(МТП-оп.31)	400	А-25+А-16
3	Ответвления к домам		А-16, А-25, СИП-2х16, СИП 4х16

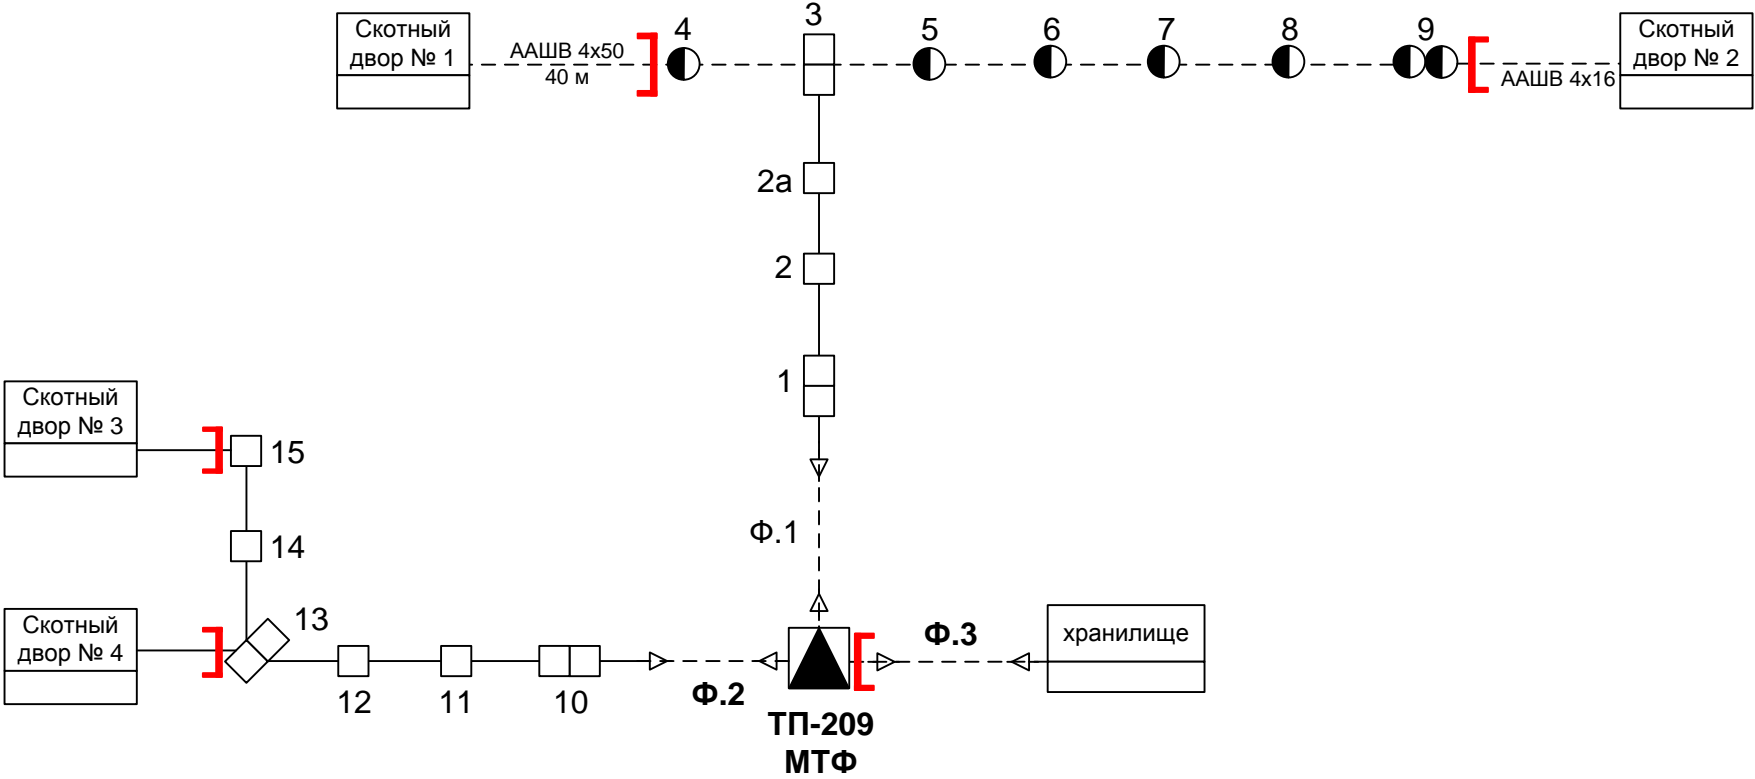

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-209 Калугино МТФ СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	12.05.15	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	12.05.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	12.05.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
