
Ведомость участков					
Nº	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля		
1	Ф.1 (БМКТП-оп.12)	335	СИП2 3х95+1х95		
2	Ф.1 (оп.7-36)	210	СИП2 3х95+1х95		
3	Ф.1 (оп.12-28)	326	СИП2 3х95+1х95		
4	Ф.1 (оп.24-107)	256	СИП2 3х95+1х95		
5	Ф. 1 (оп.103-110)	105	СИП2 3х95+1х95		
6	Ответвления к домам				

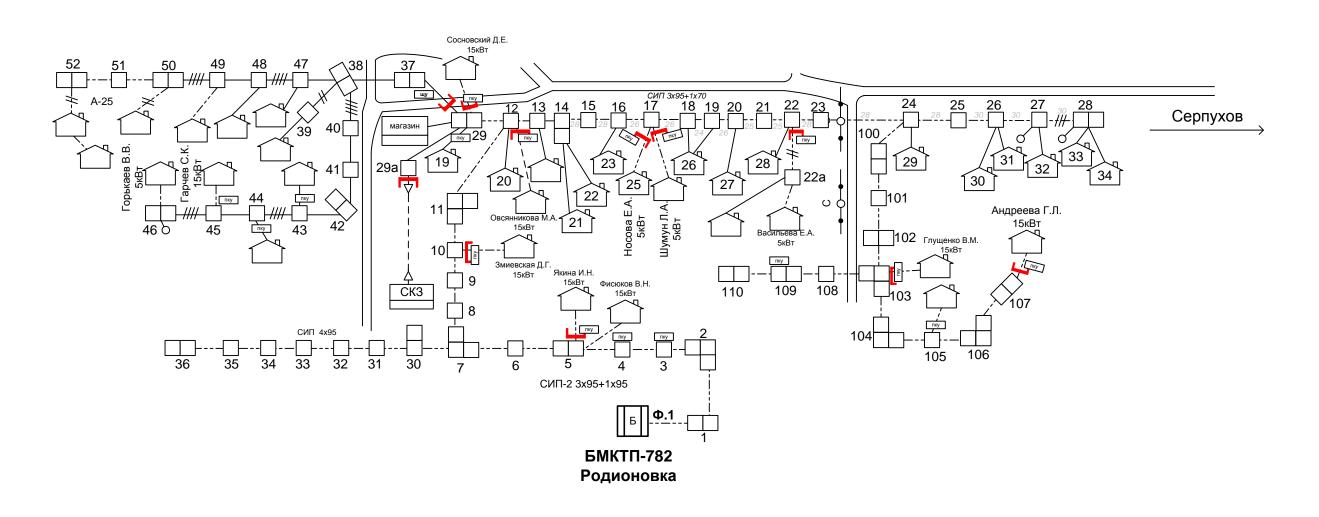

Nº	Общие сведения		
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,232	
1.1	В т.ч. кабель, км		
1.2	.2 В т.ч. СИП, км		
1.3	абоненских ВЛ, км	0,8	
1.4	абоненских КЛ, км		
2	Опор всего, шт.	64	
3	В т.ч. абонентских, шт.	17	
4	Однофазные ввода, шт.		
5	В т.ч. абонентских, шт.		
6	Трехфазные ввода, шт.		
7	В т.ч. абонентских, шт.		
8	Количество светильников, шт.		

Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		
	 -	

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-782 Родионовка СРЭС

							Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Внесение изменений в схему				Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	07.08.15			
Nº	Дата	Расп.документ	Должность	ОИФ	Подпись	Согласовал	мастер	Молодцов М.Г.	07.08.15	
						Согласовал	Macrep	тиолодцов тил.	07.00.13	
						Проверил				
						Чертил	инженер	Буева М.С.	07.08.15	
