


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1303
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1303
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	38
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	4
5	В т.ч. абонентских	4
6	Трехфазные ввода	7
7	В т.ч. абонентских	7
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.16)	563	СИП 3х70+1х70
2	Ф.1(МТП-оп.38)	740	СИП 3х70+1х70
3	Ответвления к домам	140	СИП 2х16, СИП 4х16

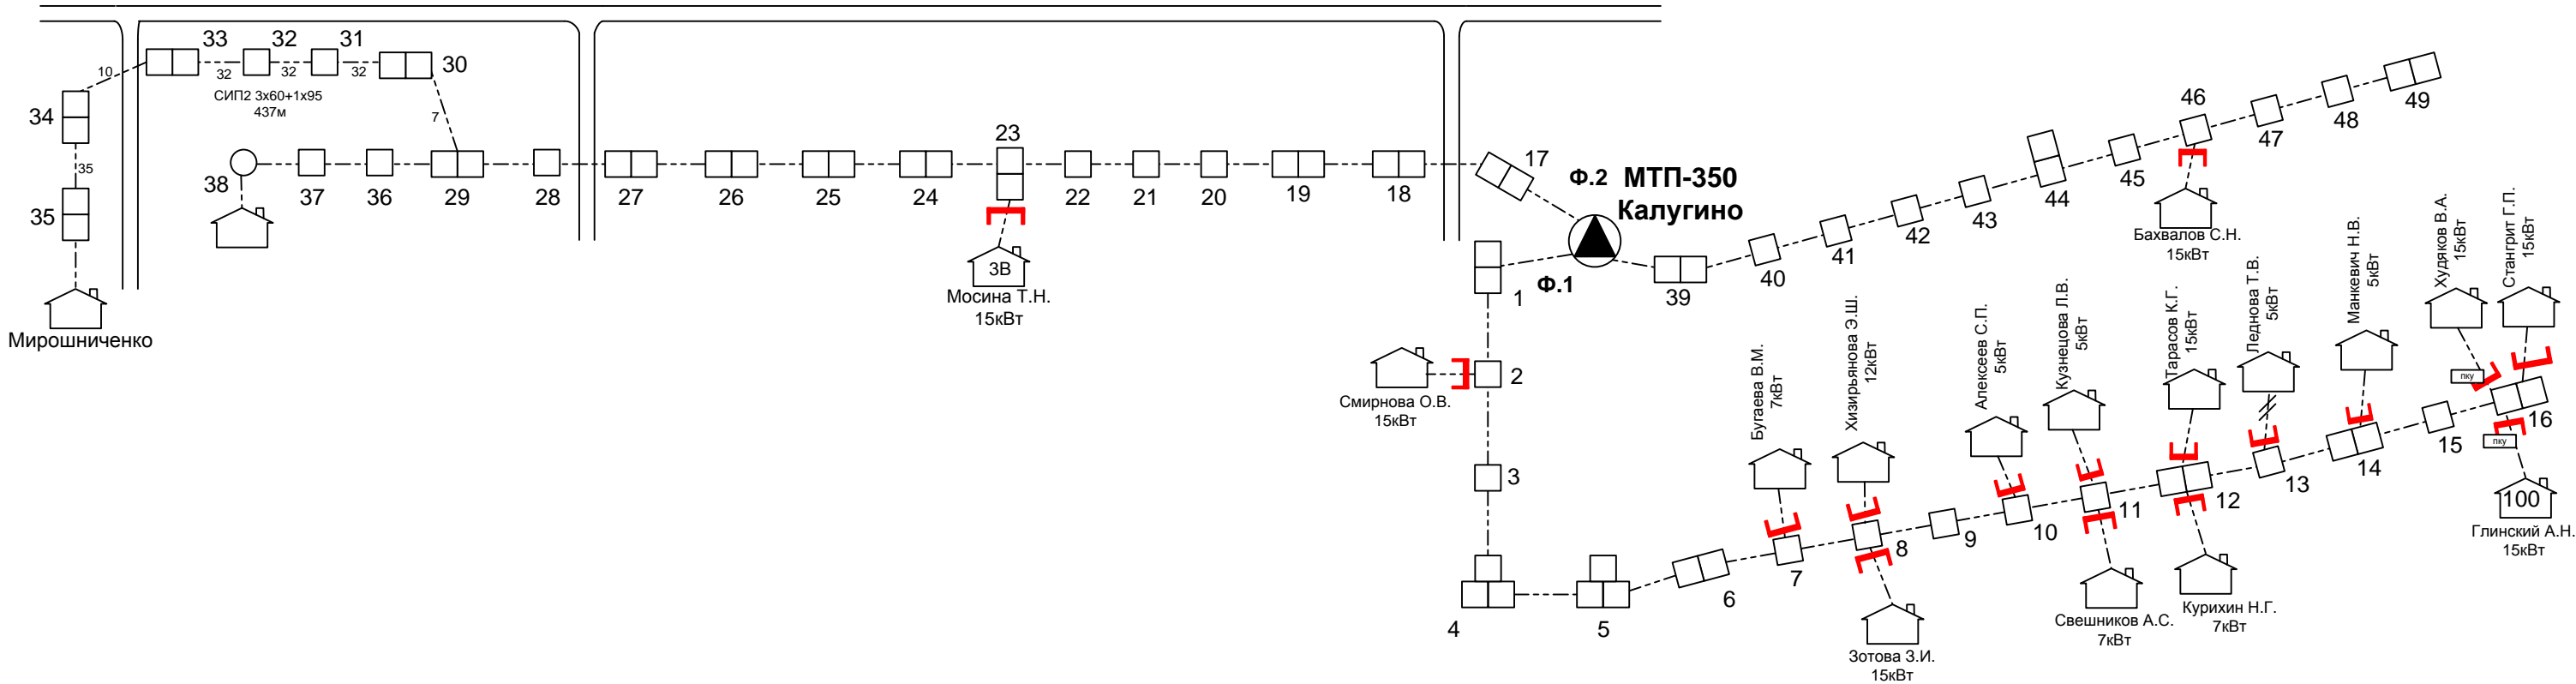

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-350 Калугино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
