


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,773
1.1	В т.ч. кабель	0,210
1.2	В т.ч. СИП	0,969
1.3	абонентских ВЛ	180
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор СРЭС	71
2	В т.ч. одност.ж/б	46
2	В т.ч. сложн.ж/б	22
2	В т.ч. одност.дерев.	
3	Опор абонентских	4
4	Однофазные ввода	57
5	В т.ч. абонентских	8
6	Трехфазные ввода	6
7	В т.ч. абонентских	6
8	Количество светильников	18

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.34)	594	А-35
2	Ф.1 (оп.2-2а-39)	359	СИП
3	Ф.2 (МТП-оп.43)	210	АВБШВ 4х70
4	Ф.2 (оп.43-54)	334	СИП 4х50
5	Ф.3 (МТП-оп.63)	276	СИП 4х70
6	Ответвления к домам		СИП 2х16

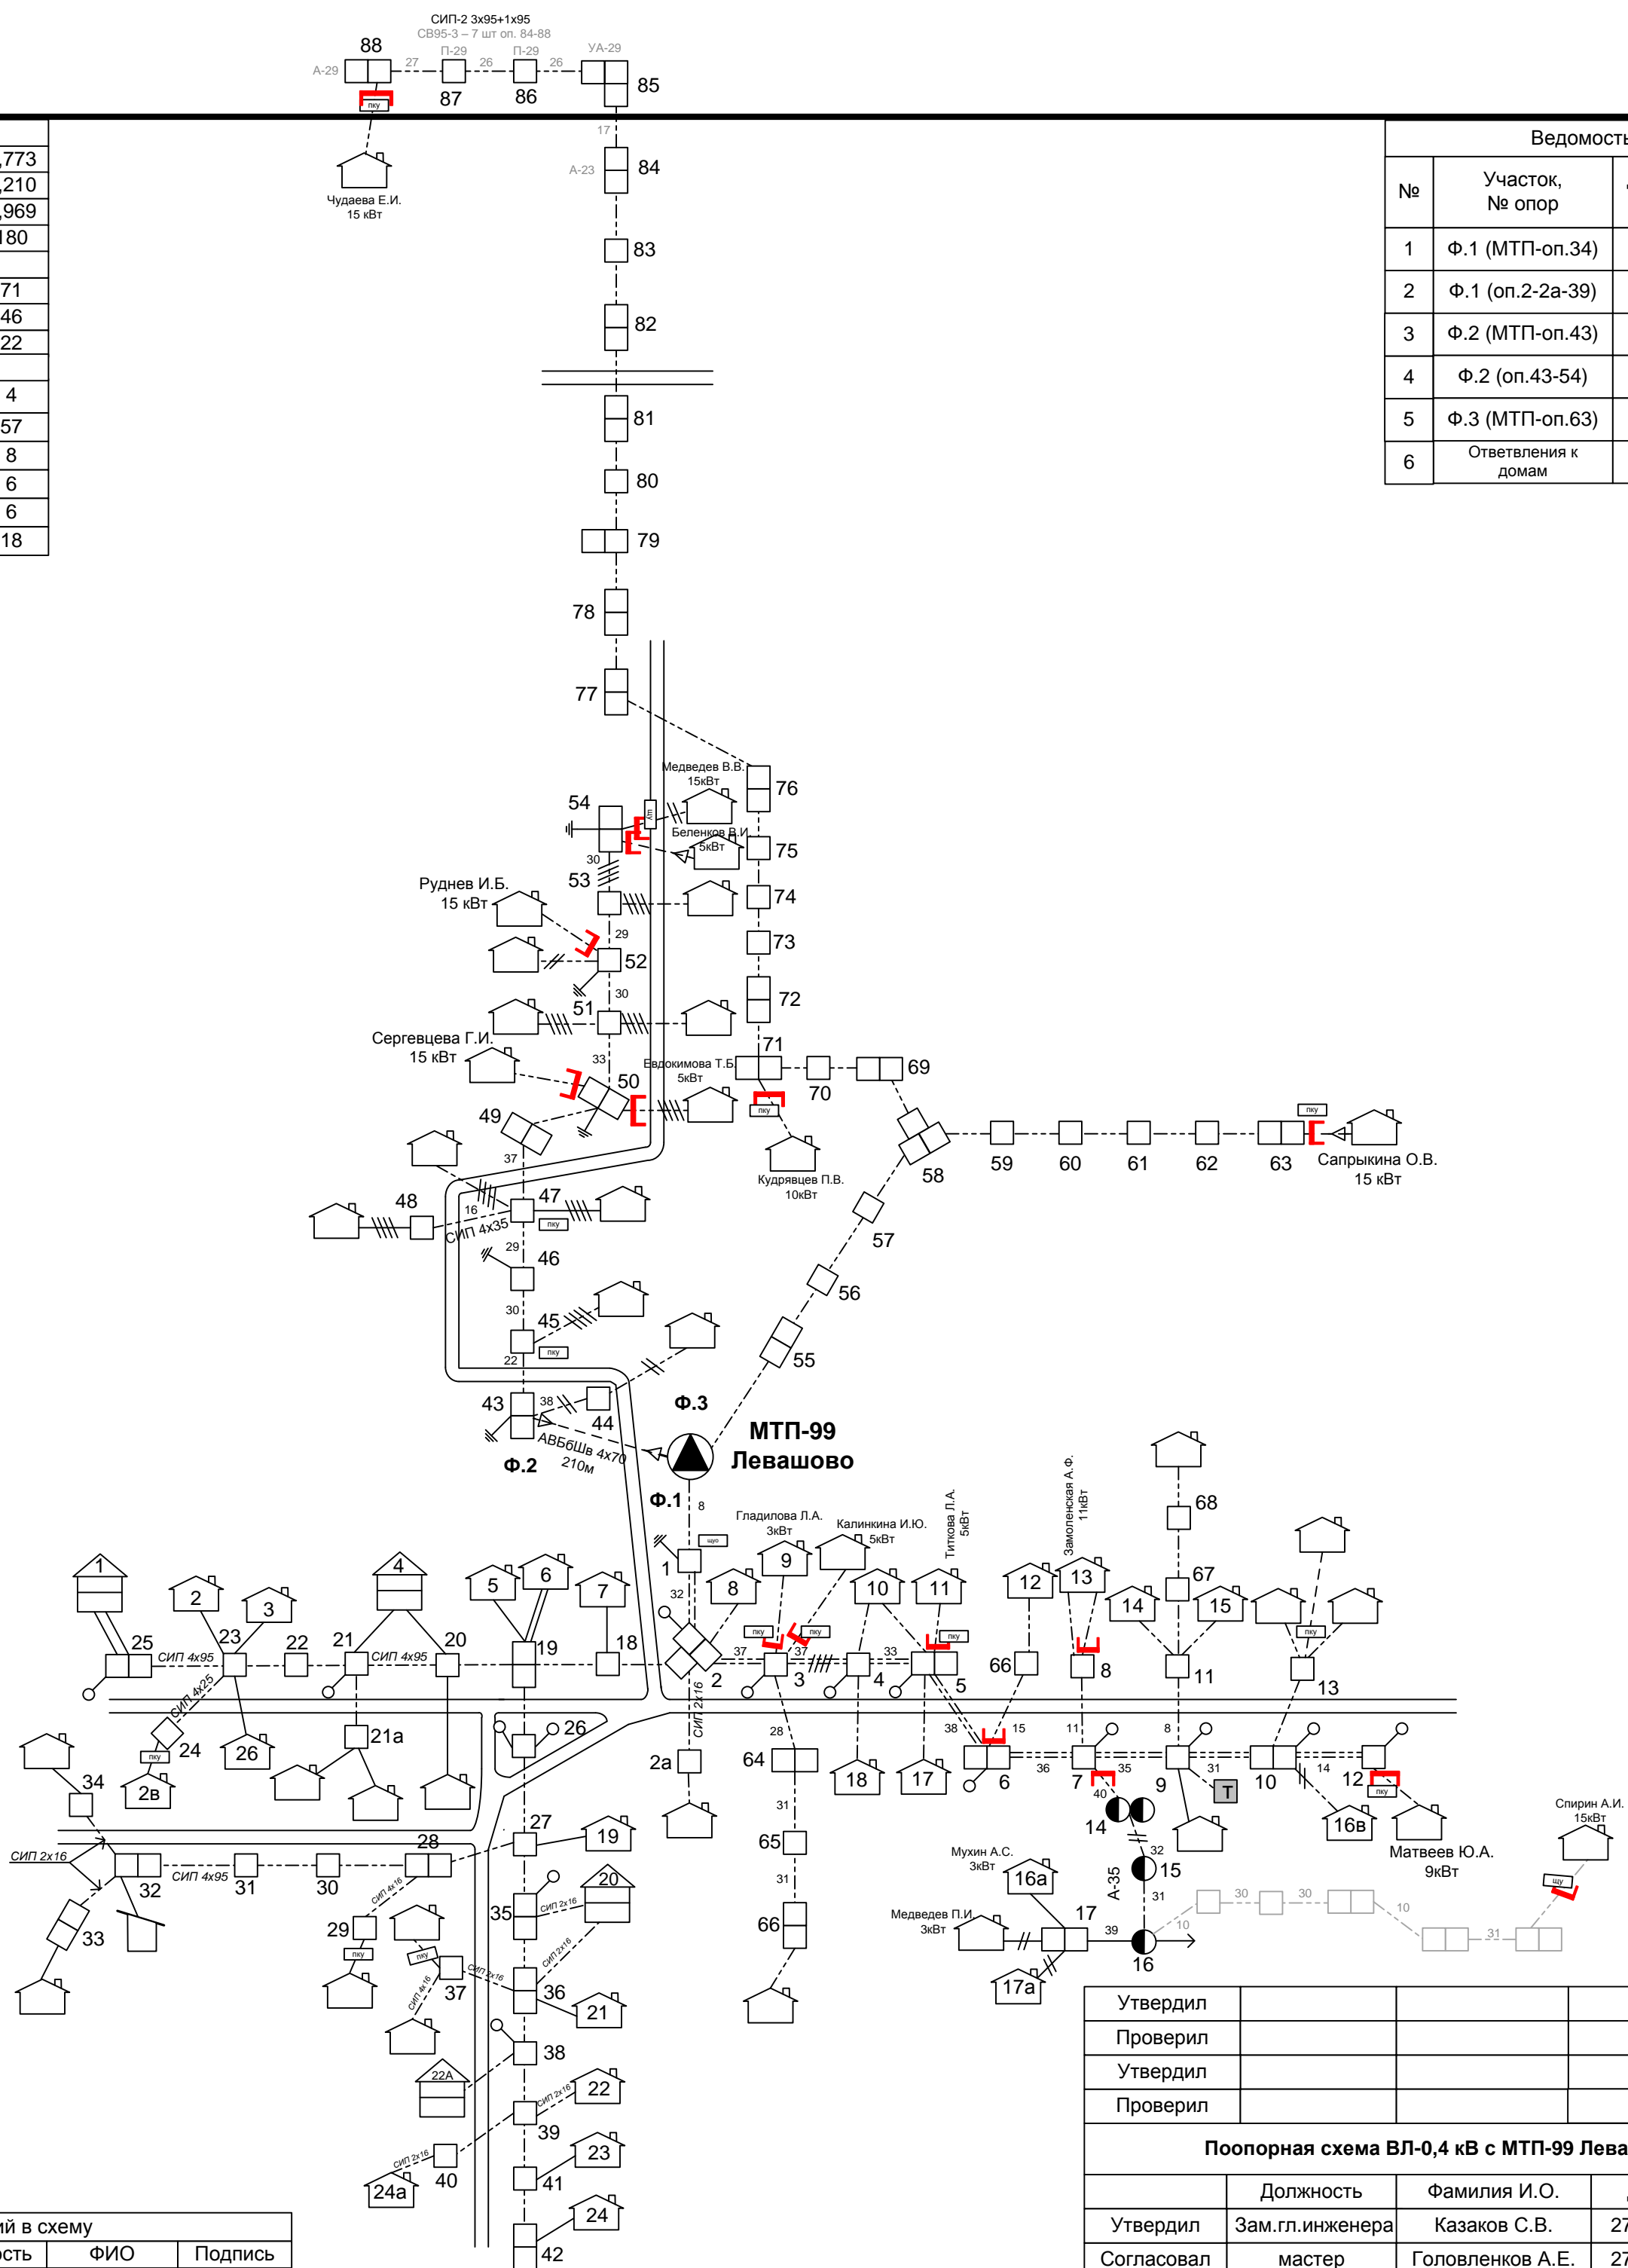

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-99 Левашово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	27.01.14	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	27.01.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	27.01.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	27.01.14	
