


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,297
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,297
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	9
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	
9		

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.7)	227	СИП2 3х95+1х95
2	Ф.1 (оп. 5-9)	70	СИП2 3х95+1х95
3	Ответвления к домам		

МТП-721
Подмоклово

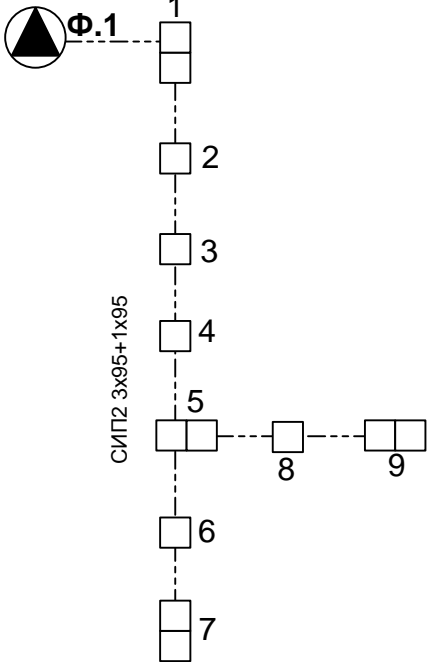

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-721 Подмоклово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Инженер	Хромова М.Ю.		
Чертил	Инженер	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
