


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2,240
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,000
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	63
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	БМКТП-оп.10	304	СИП2 3х95+1х95
2	БМКТП-оп.63	186	СИП2 3х95+1х95
3	Оп.5-57	510	СИП2 3х95+1х95
4	Оп.11-23-42	1240	А-50
5	Ответвления к домам		

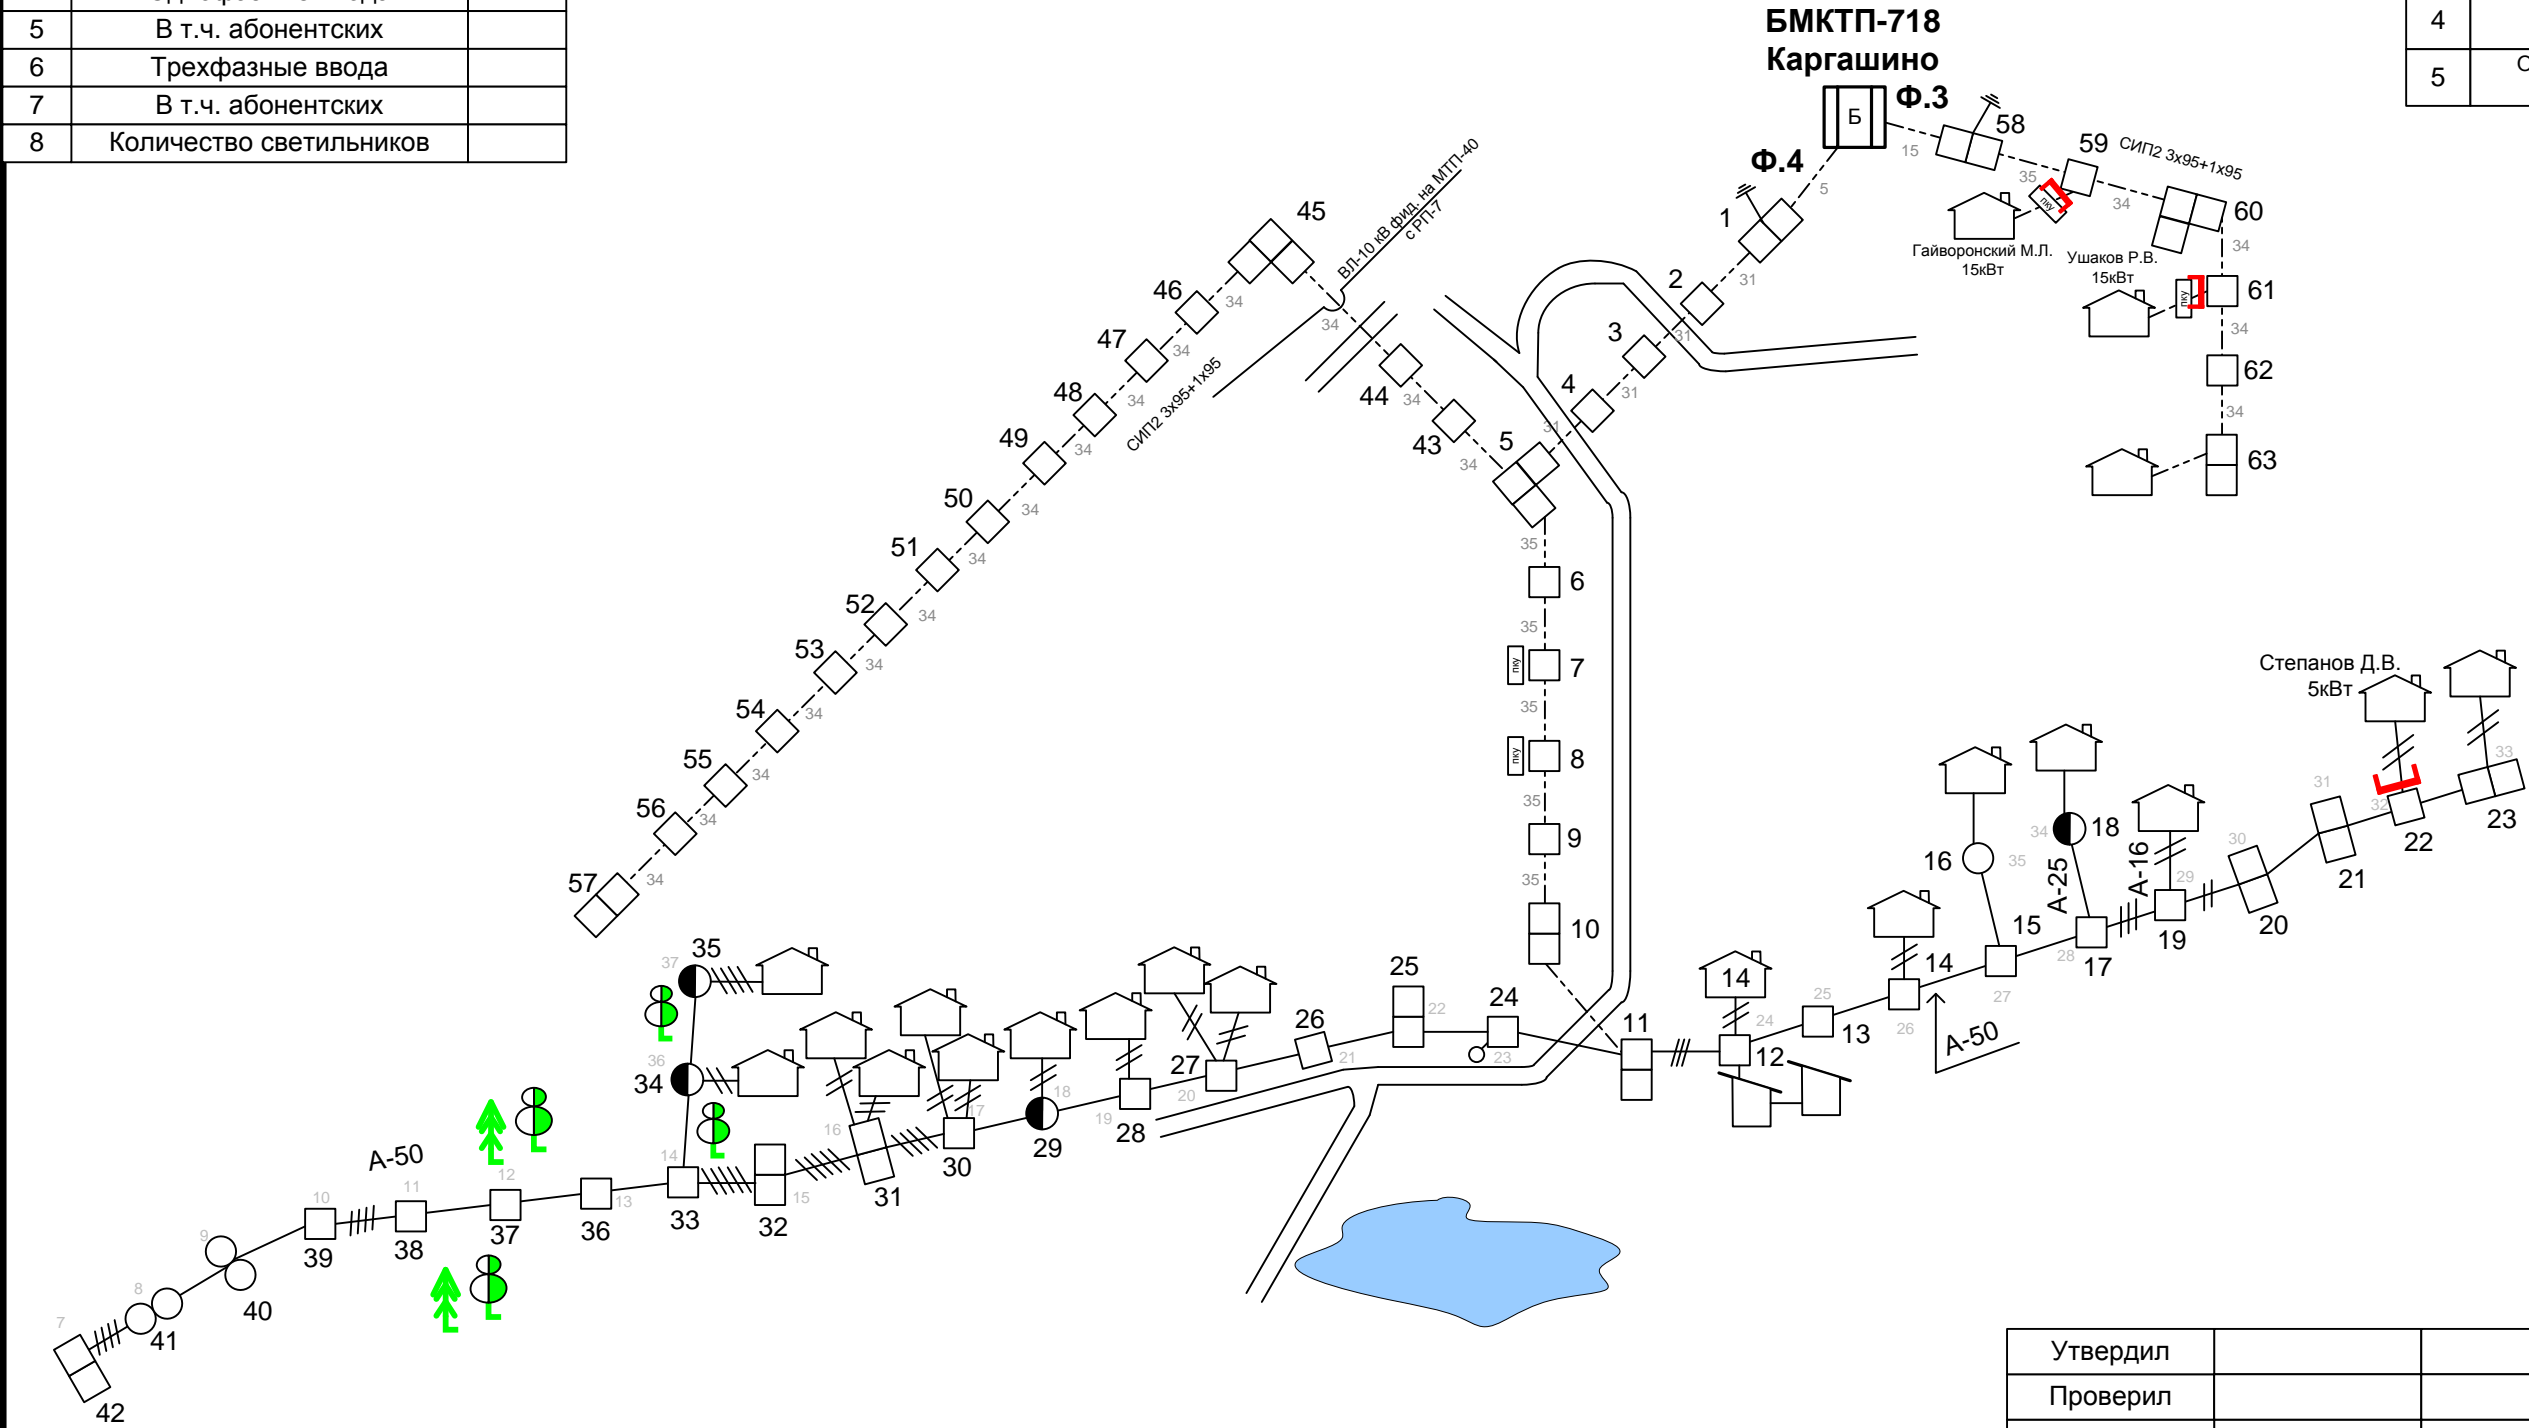

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-718 Каргашино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	15.10.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	15.10.15	
Проверил				
Чертил	Инженер	Буева М.С.	15.10.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
