


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,575
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,575
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	18
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.13)	449	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф.2 (МТП-оп.18)	126	СИП-2 3х95+1х95
3			
4	Ответвления к домам		А-16,А-25,СИП2х16

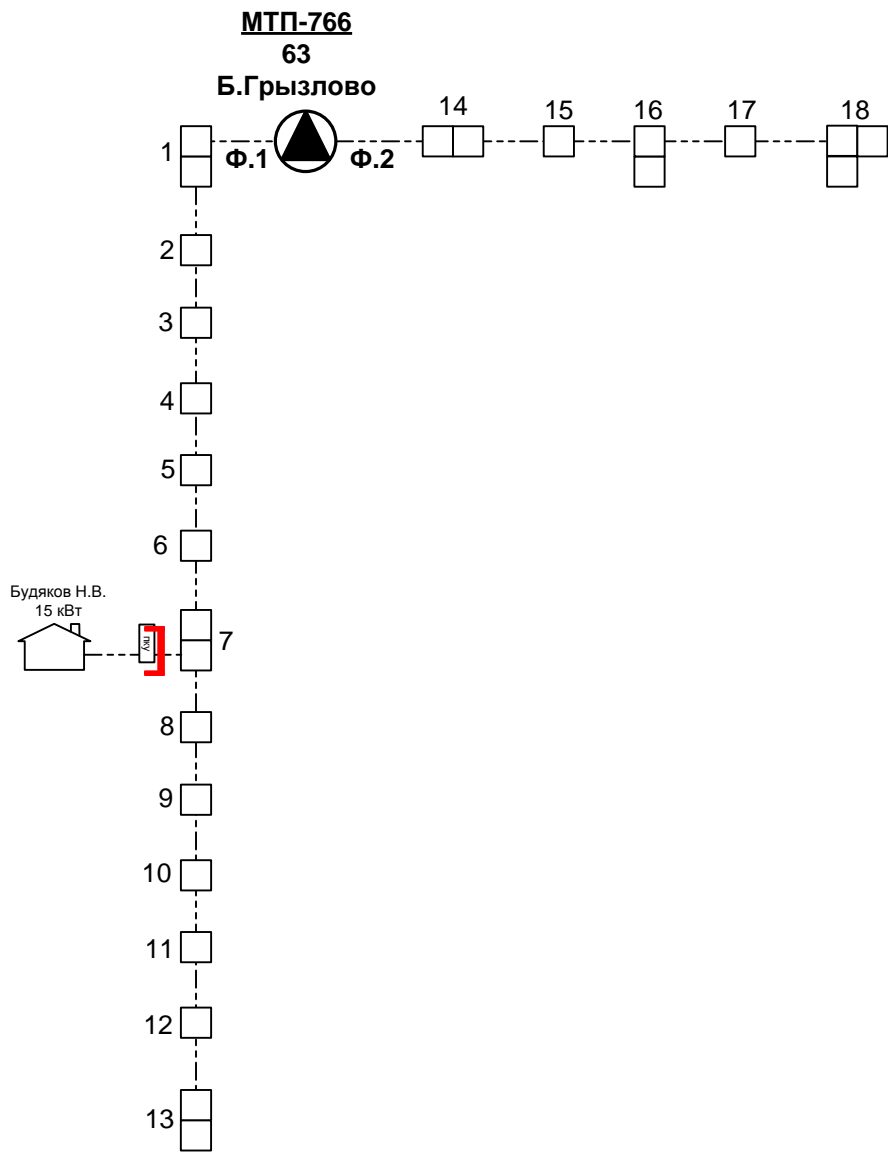

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-766 д. Большое Грызлово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	гл.инженер	Казаков С.В.	02.07.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	02.07.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.07.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
