


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего, км	0,095
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,095
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	4
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.4)	95	СИП2 3х95+1х95
2			
3	Ответвления к домам		

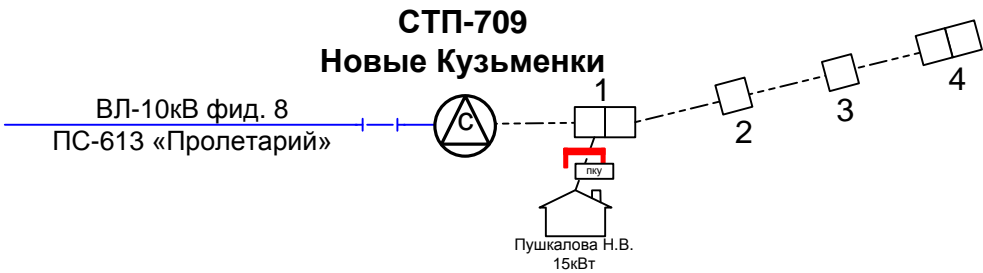

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с СТП-709 д. Новые Кузьменки СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
