


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.2(оп.9-20-26)	120	СИП 4х70
2	Ф.2 (БМКТП-оп.9)	315	СИП
3	Оп.4-64	127	СИП2 3х95+1х95
4	Оп.9-24	105	СИП
5	Оп.26-47	595	СИП 4х95
6	Оп.30-37	266	А-35
7	Оп.20-21	40	А-35
8	Оп.20-19	80	А-35
9	Оп.5-51	140	СИП
10	Оп.5-59	396	СИП
11	Оп.37-83	560	СИП2 3х95+1х95
12	Оп.47-97	105	СИП2 3х95+1х95
13	Ответвления к домам		А-16, А-25, СИП 2х16

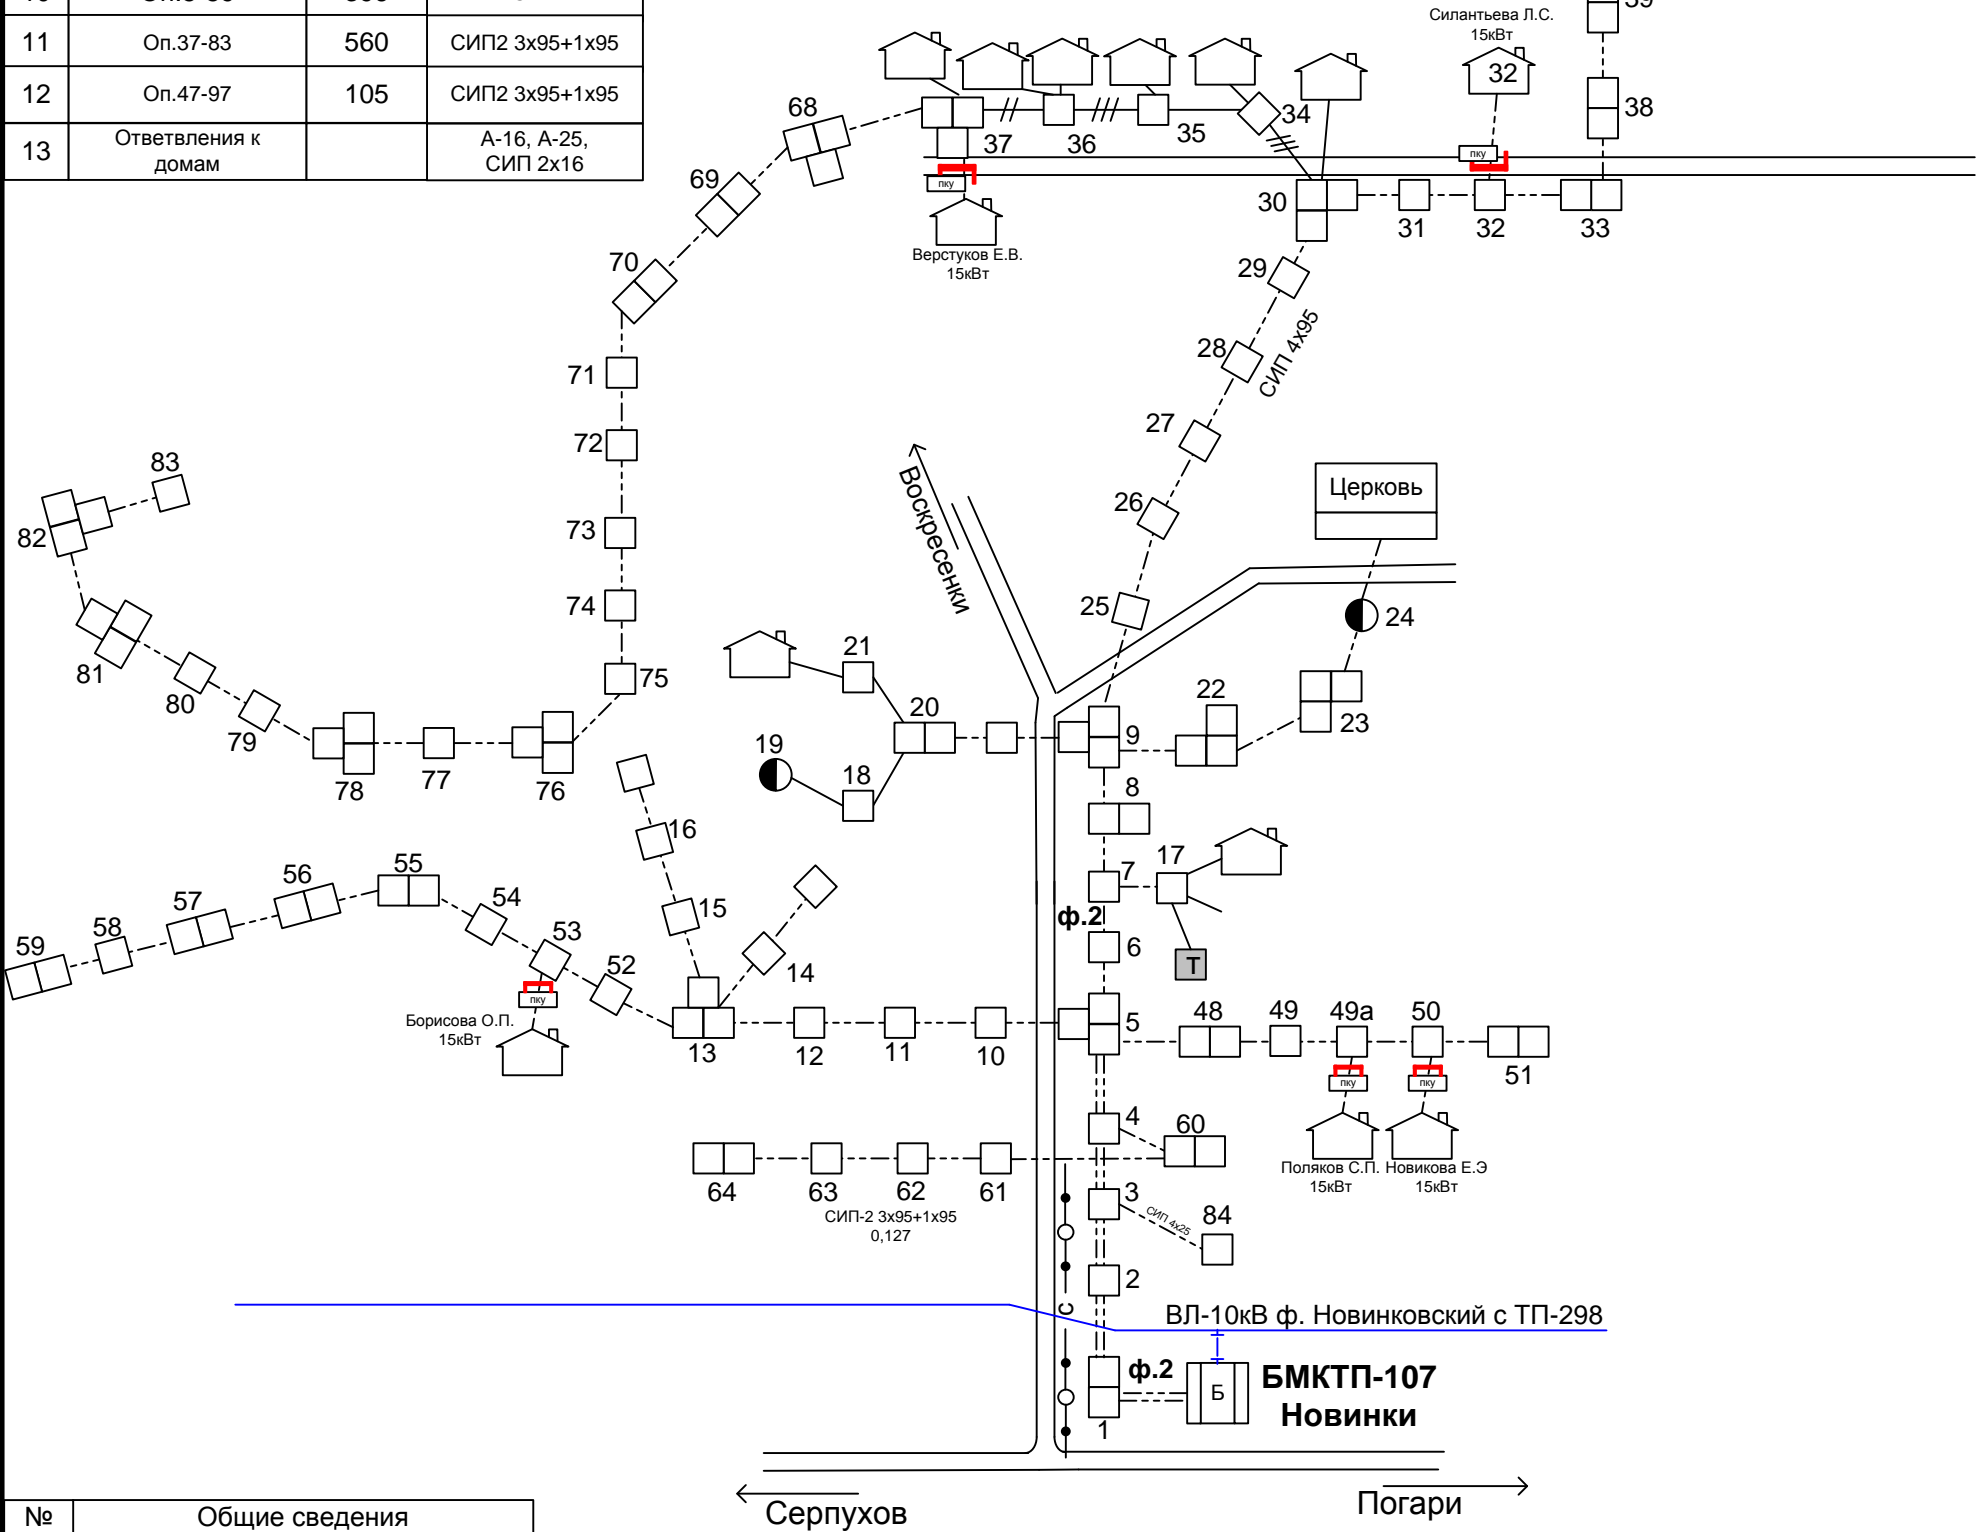

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего	2,849
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	2,463
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор СРЭС всего, шт	85
3	Опор абонентских, шт	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-107 Новинки СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	19.09.14	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	19.09.14	
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.	19.09.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	19.09.14	
