


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2,108
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,478
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	64
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	22
5	В т.ч. абонентских	1
6	Трехфазные ввода	2
7	В т.ч. абонентских	2
8	Количество светильников	8

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.3)	85	СИП 4x70+1x16
2	Ф.1 (оп.3-27)	1000	А-35
3	Ф.2 (МТП-оп.42)	510	СИП 4x95
4	Ф.2 (оп.29-46)	140	СИП 4x95
5	Ф.3 (МТП-оп.56)	218	СИП 4x95
6	Ф.1 (оп.18-27-62)	525	СИП 4x95
7	Ответвления к домам	380	А-16, А-25

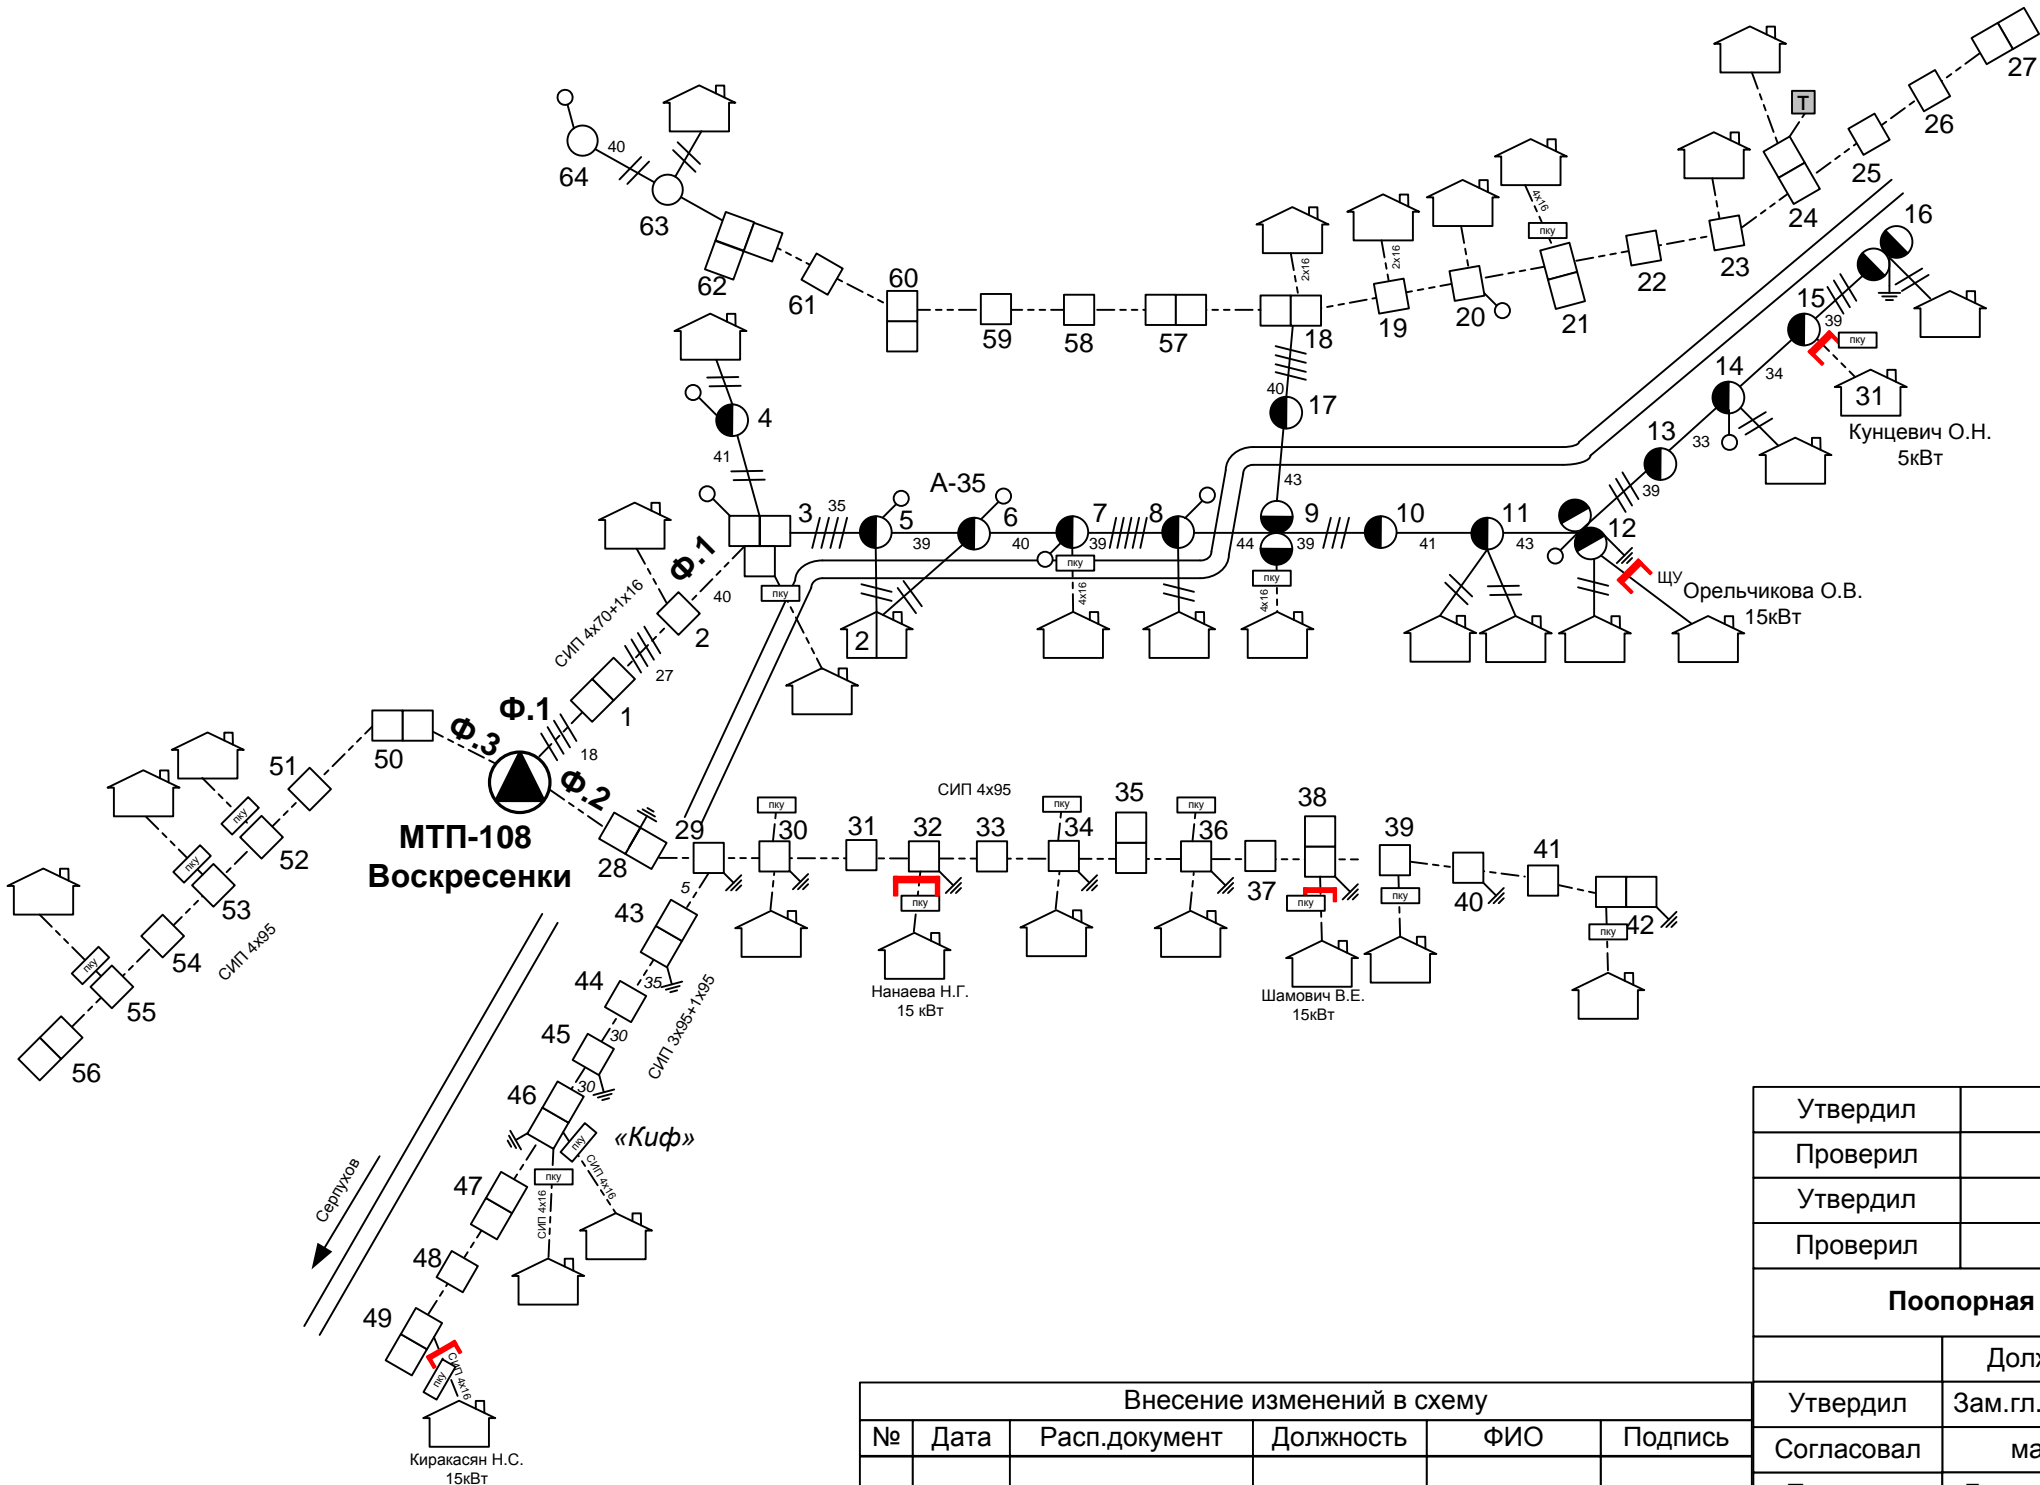

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-108 Воскресенки СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	09.07.14.	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	09.07.14.	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	09.07.14.	
Чертил	техник	Буева М.С.	09.07.14.	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
