


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1567
1.1	В т.ч. кабель	87
1.2	В т.ч. СИП	360
1.3	абоненских ВЛ	520
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	50
3	В т.ч. абонентских	13
4	Однофазные ввода	41
5	В т.ч. абонентских	4
6	Трехфазные ввода	6
7	В т.ч. абонентских	3
8	Количество светильников	

032-32724

+121=1688

+121=481

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.1)	42	АВВГ 3х120+1х50
2	Ф.1(оп.1-12; 13-32)	1240	А-50
3	Ф.1(оп.12-13)	40	СИП 3х50+54,6
4	Ф.1(оп.25-42)	280	СИП 4х25
5	Ф.2(МТП-оп.1)	45	АВББШВ 4х70
6	Ф.2(оп.1-4)	120	А-50
7	Ф.2(оп.4-48)	120	СИП 2х25
8	Ф.1 (оп.13-54)	121	СИП-2 3х95+1х95
9	Ответвления к домам	880	А-16,А-25,СИП

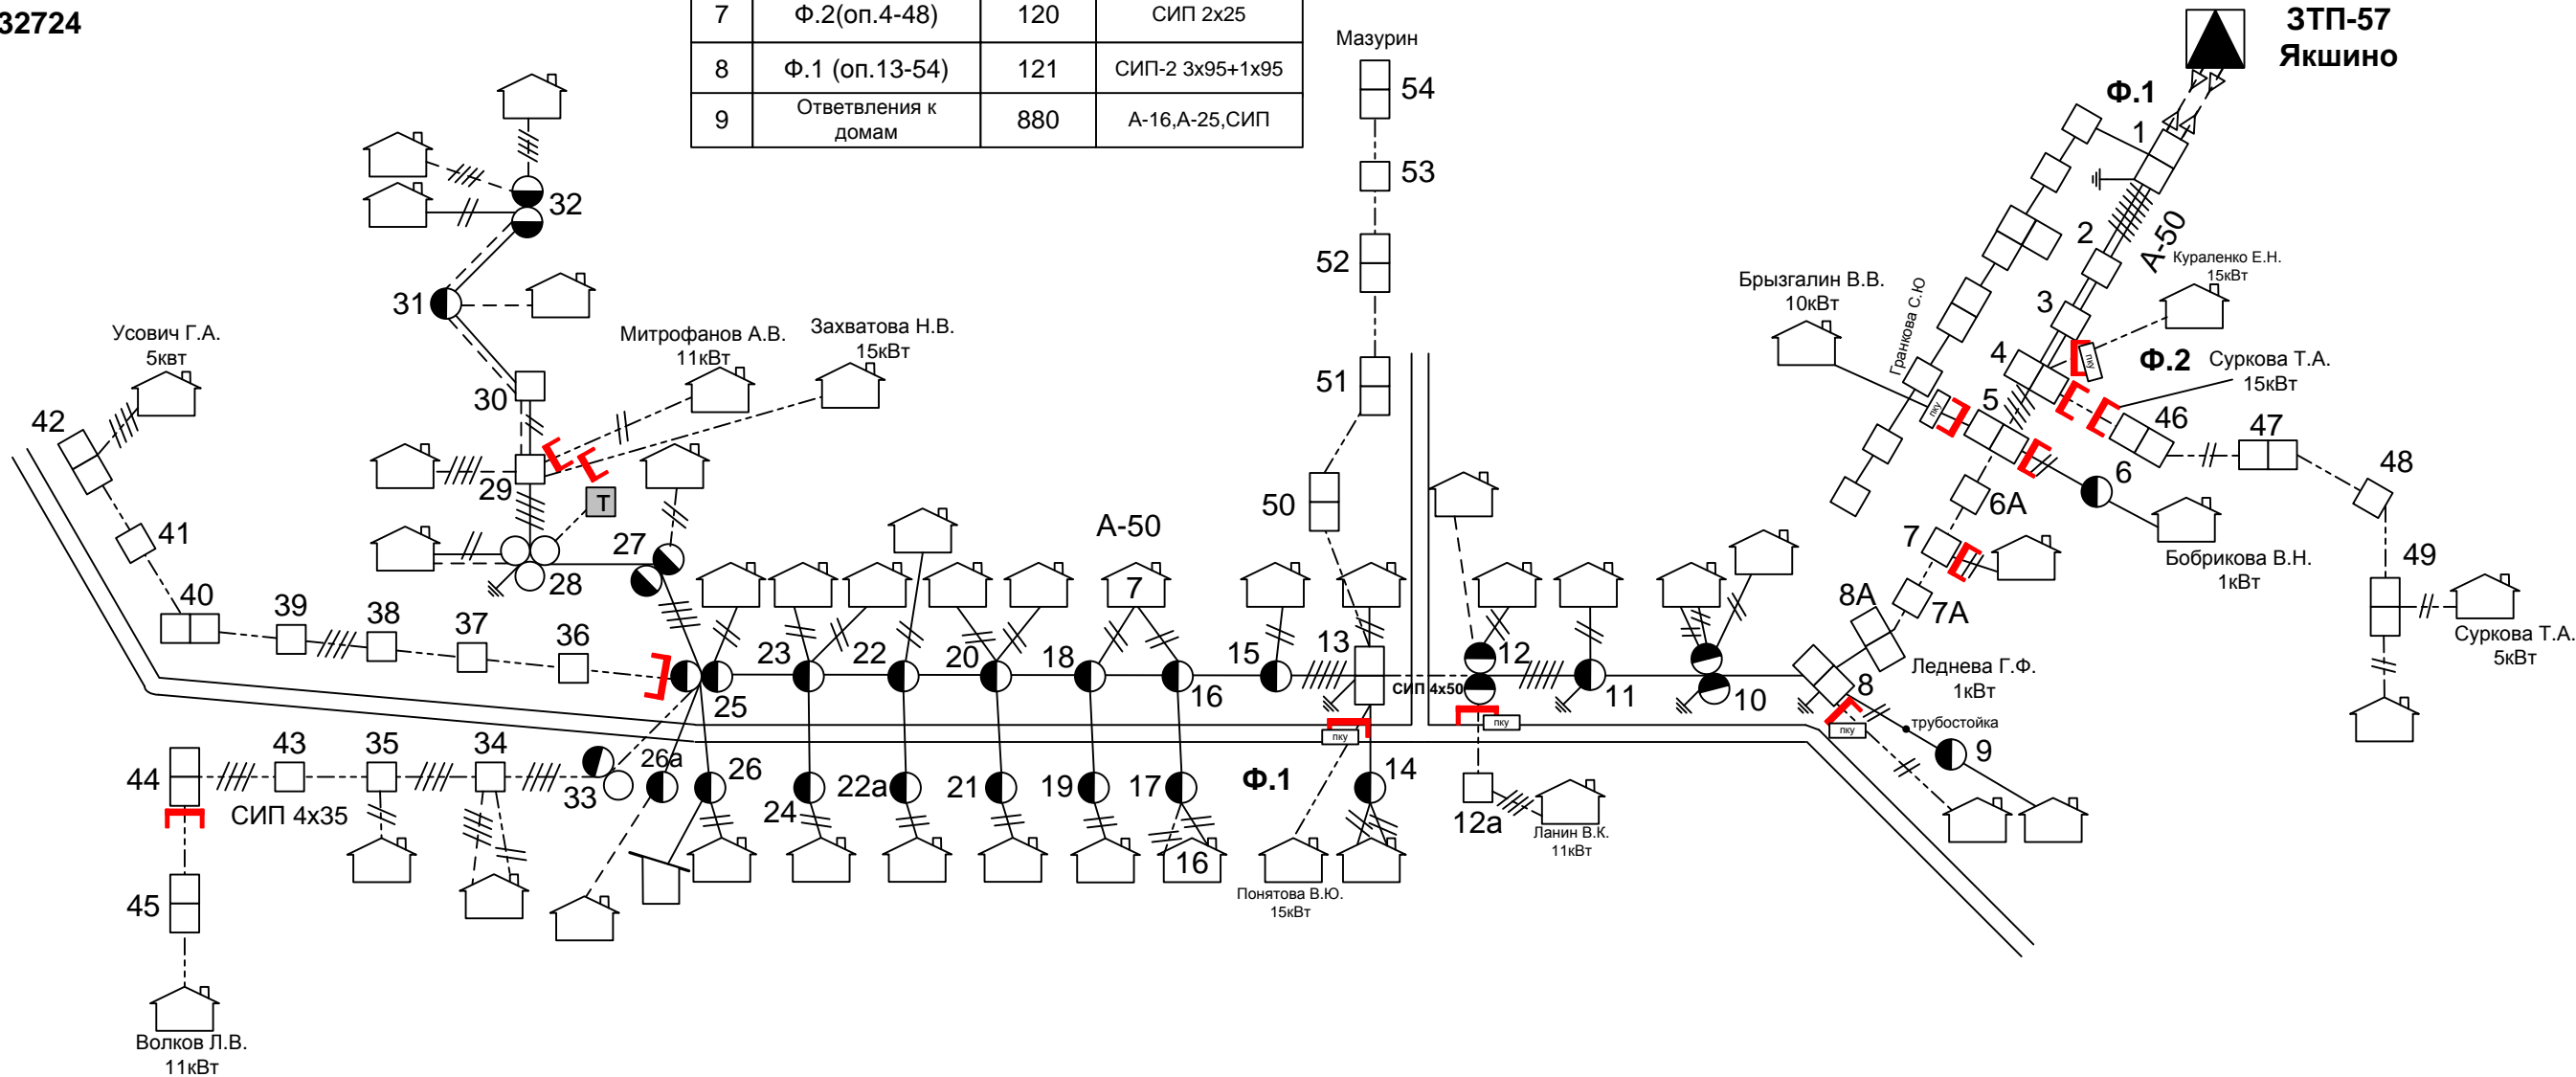

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-57 Якшино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Лапко И.Н.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.04.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
