


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,9
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего, СРЭС	54
3	Опор абонентских	
4	Однофазные вводы	
5	В т.ч. абонентских	3
6	Трехфазные вводы	5
7	В т.ч. абонентских	5
8	Количество светильников	8

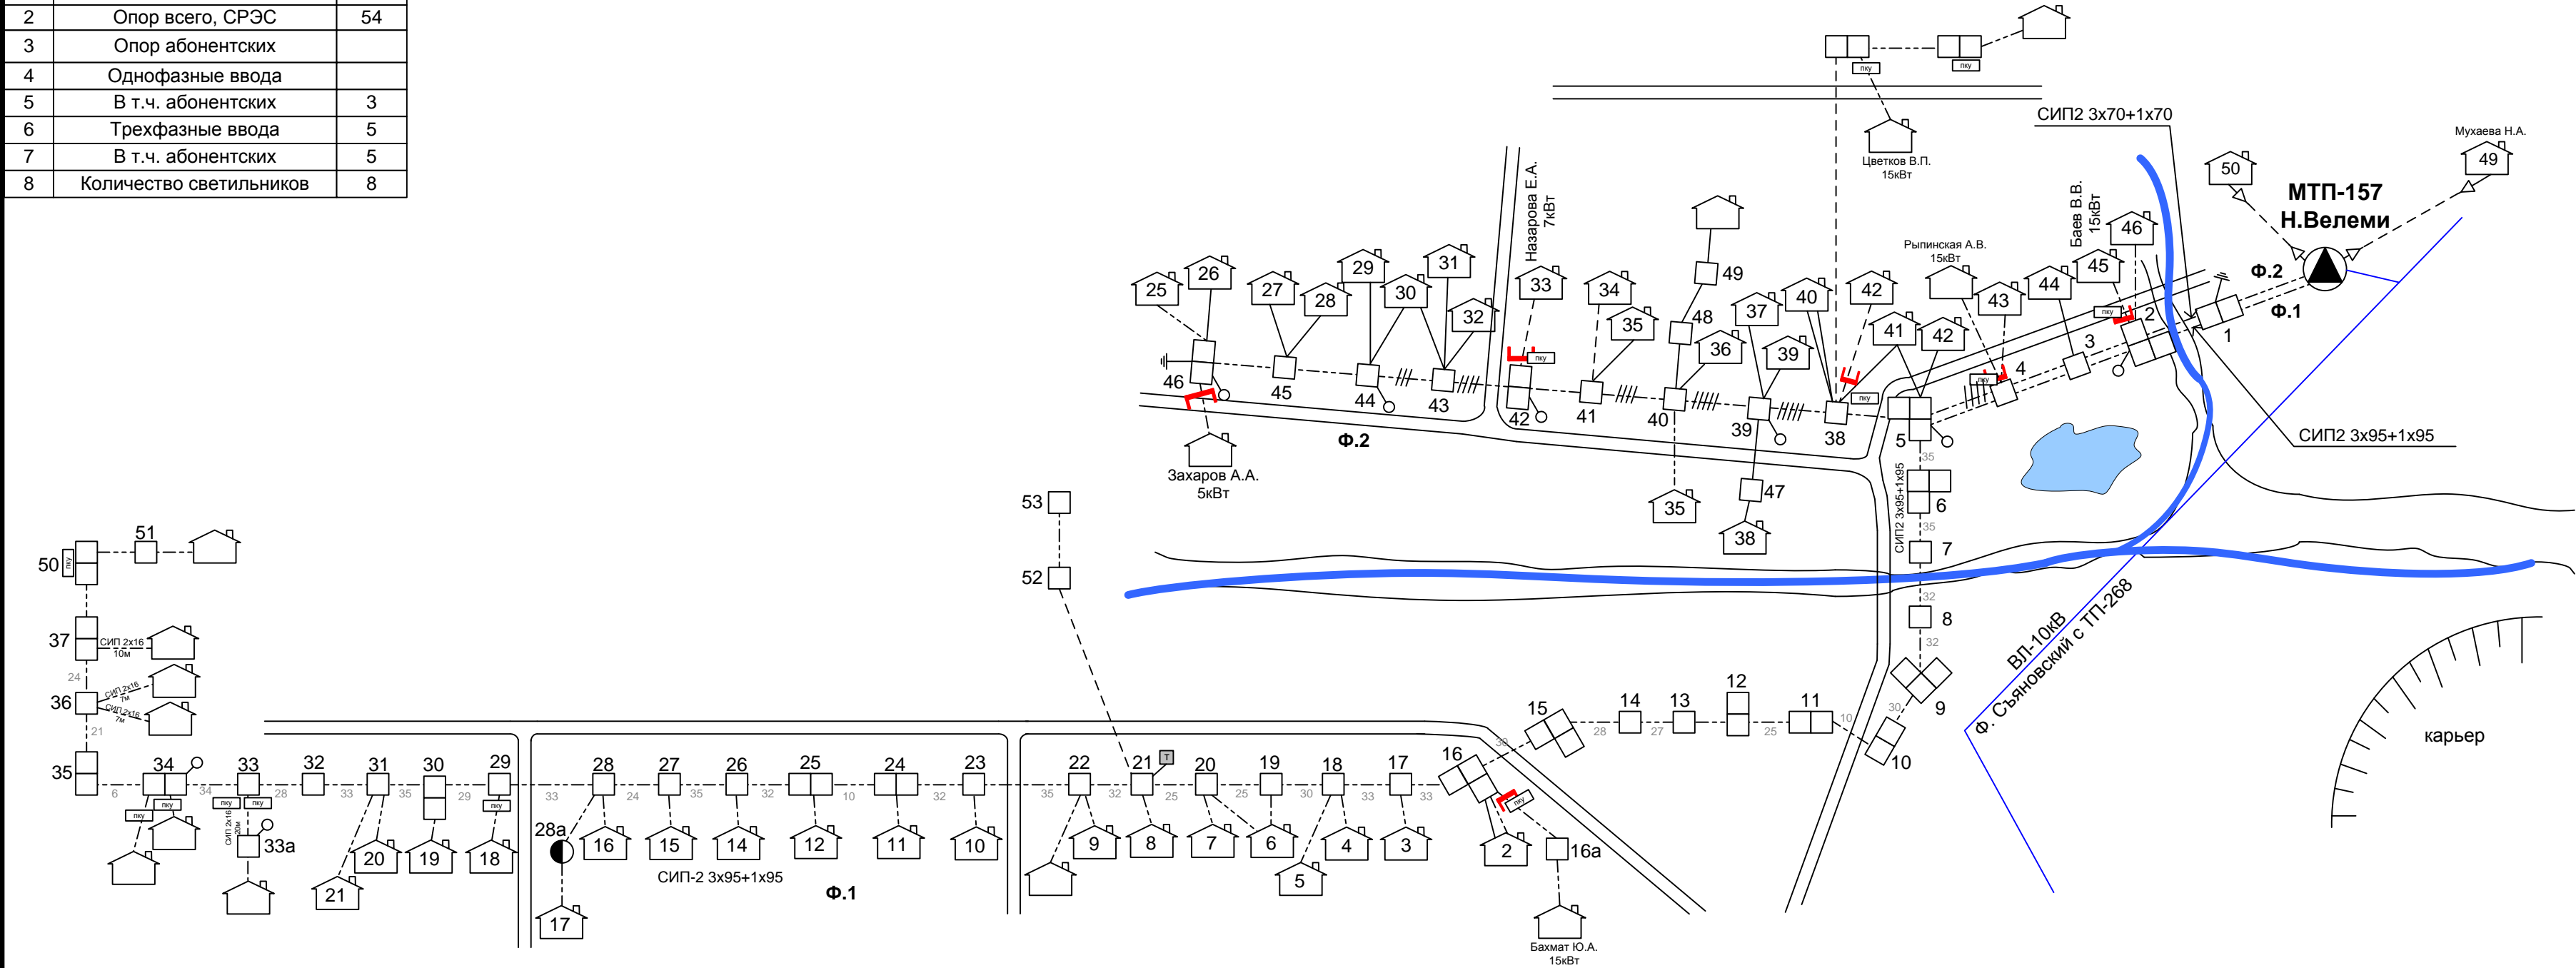

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.37-оп.51)		СИП2 3х95+1х95
2	Ф.1 (оп.5-37)	901	СИП-2 3х95+1х95
3	Ответвления к домам	1100	А-16, А-25, СИП

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-157 Н.Велеми СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
