
Nº	Общие сведения				
1	Протяженность всего (СРЭС)	2900			
1.1	В т.ч. кабель				
1.2	В т.ч. СИП	60			
1.3	абоненских ВЛ	40			
1.4	абоненских КЛ				
2	Опор всего	74			
3	В т.ч. абонентских	1			
4	Однофазные ввода	48			
5	В т.ч. абонентских	4			
6	Трехфазные ввода	1			
7	В т.ч. абонентских	1			
8	Количество светильников				

Ведомость участков							
Nº	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля				
1	Ф.1(МТП-оп.31)	1300	AC-35				
2	Ф.2(МТП-оп.2)	60	СИП 4х70				
3	Ф.2(оп.2-38-68)	840	AC-35				
4	Ф.2(оп.36-50)	560	A-35				
5	Ответвления к домам	960	А-16,А-25,СИП 2х16				

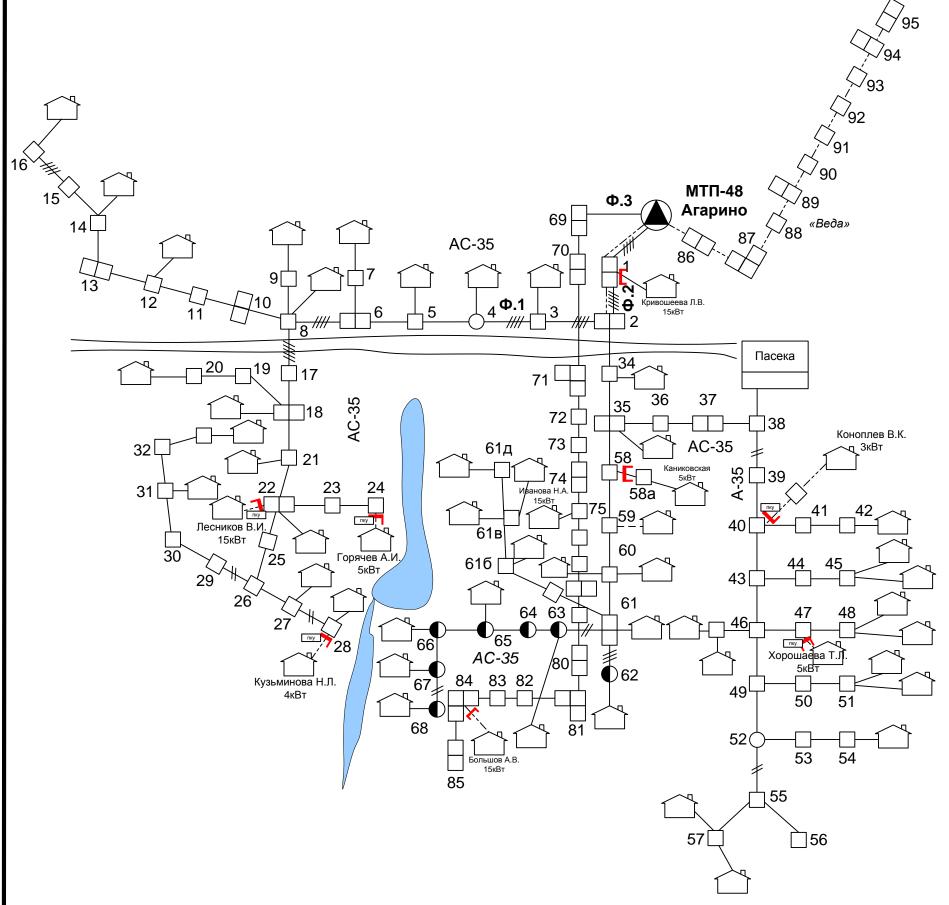

Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-48 Агарино СРЭС

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
							Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
	Внесение изменений в схему			Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.				
Nº	Дата	Расп.документ	Должность	ОИФ	Подпись	Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
						Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
						Чертил	техник	Буева М.С.		
