


| № | Общие сведения | |
|-----|-------------------------------|------|
| 1 | Протяженность всего (СРЭС),км | 1,48 |
| 1.1 | В т.ч. кабель, км | |
| 1.2 | В т.ч. СИП, км | 0,53 |
| 1.3 | абоненских ВЛ, км | 0,84 |
| 1.4 | абоненских КЛ, км | |
| 2 | Опор всего, СРЭС | 40 |
| 3 | Опор абонентских, шт. | 21 |
| 4 | Однофазные ввода, шт. | 19 |
| 5 | В т.ч. абонентских, шт. | 14 |
| 6 | Трехфазные ввода, шт. | |
| 7 | В т.ч. абонентских, шт. | |
| 8 | Количество светильников, шт. | 15 |

032-321710

ярмарка

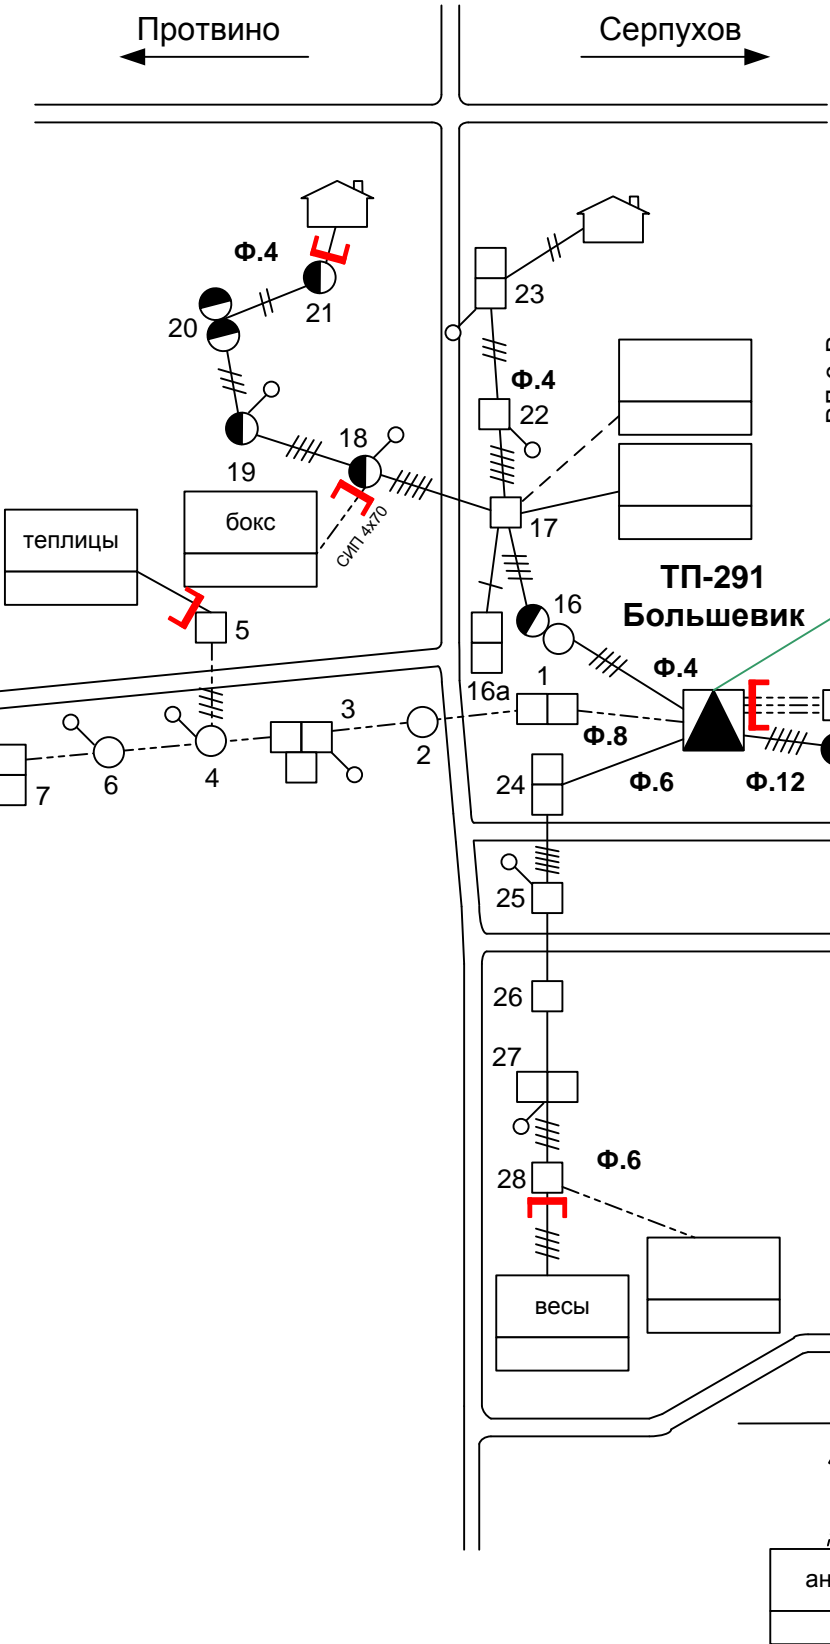

Ведомость участков

| № | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля |
|---|---------------------|----------|--------------------------------|
| 1 | Ф.8(МТП-оп.12) | 410 | СИП 4x95 |
| 2 | Ф.8(оп.12-15) | 120 | А-50 |
| 3 | Ф.6(МТП-оп.28) | 170 | А-50 |
| 4 | Ф.4(МТП-оп.21) | 330 | А-50 |
| 5 | Ф.12(МТП-оп.36) | 290 | А-50 |
| 6 | Ф.12(оп.36-39) | 120 | СИП |
| 7 | Ответвления к домам | | А-16, А-25, СИП-2x16, СИП 4x16 |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|------------|--------------|----------|---------|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-291 Большевик теплицы СРЭС | | | | |
| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | Гл.инженер | Казаков С.В. | 02.09.15 | |
| Согласовал | мастер | Иванов Ю.М. | 02.09.15 | |
| Проверил | | | | |
| Чертил | инженер | Буева М.С. | 02.09.15 | |
