


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,570
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,570
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	19
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(оп.1-19)	214	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф.2(оп.1-2-13)	337	СИП-2 3х95+1х95
3	Ответвления к домам		

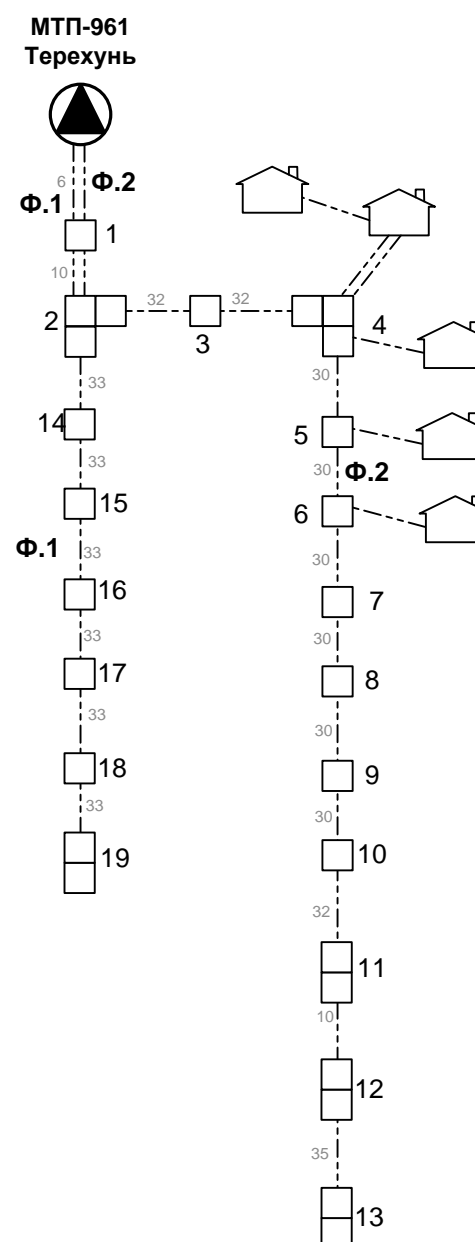

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с МТП-961 д.Терехунь СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
	Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	25.05.15
	Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	25.05.15
	Проверил			
	Чертил	инженер	Буева М.С.	25.05.15

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
