


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),м	1484
1.1	В т.ч. кабель, м	
1.2	В т.ч. СИП, м	1484
1.3	абоненских ВЛ, м	
1.4	абоненских КЛ, м	
2	Опор всего, шт.	45
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	15
5	В т.ч. абонентских, шт.	2
6	Трехфазные ввода, шт.	11
7	В т.ч. абонентских, шт.	11
8	Количество светильников, шт.	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(1-21)	684	СИП2 4х70
2	Ф.2(15-34)	800	СИП2 4х70

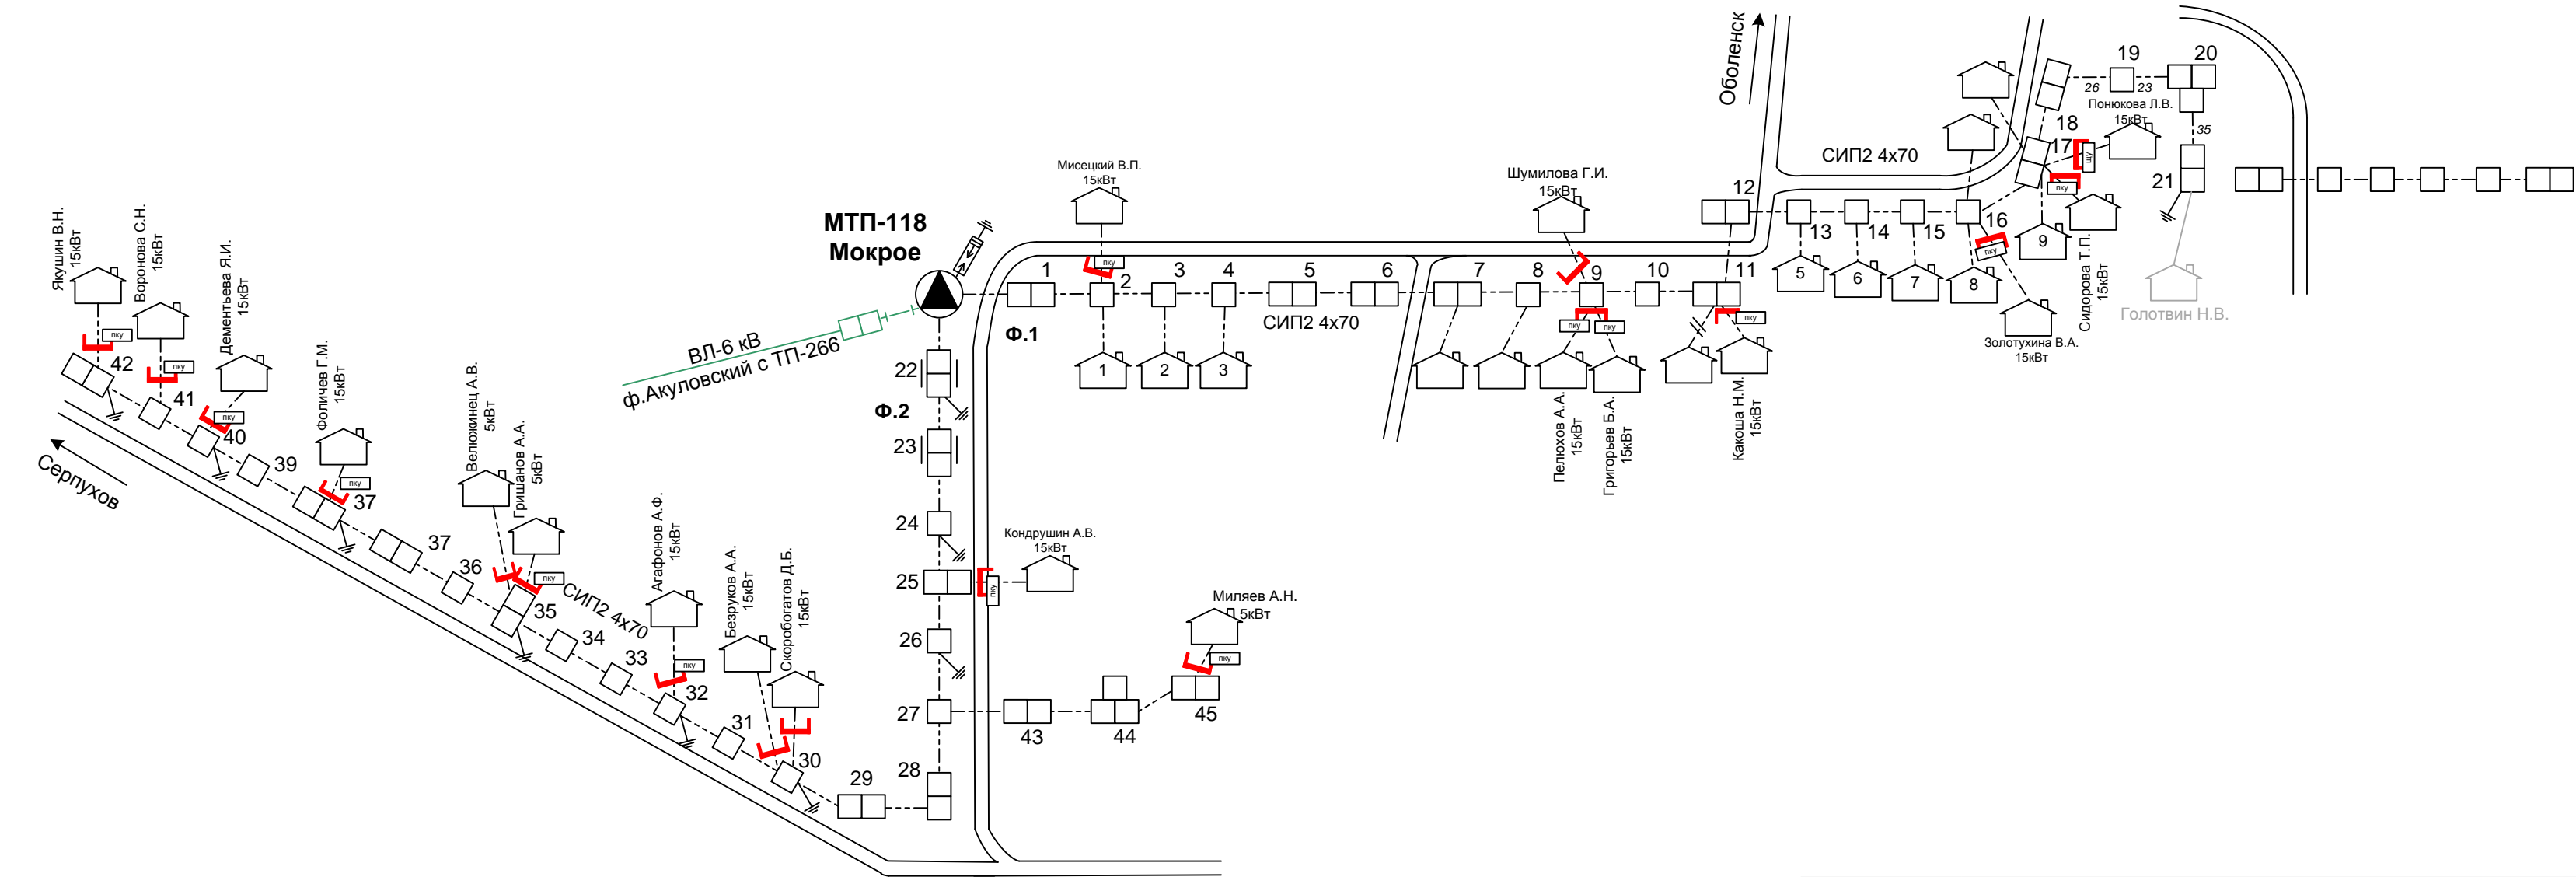

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-118 Мокрое СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казakov С.В.	25.07.14	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	25.07.14	
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.	25.07.14	
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.	25.07.14	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
