
Nº	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,845
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,845
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	30
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	
9		

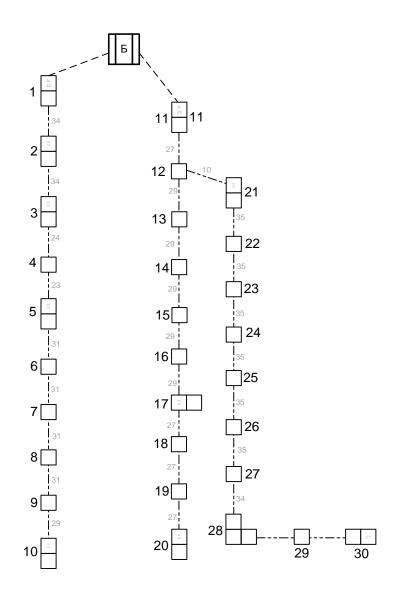

	Ведомость участков				
Nº	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля		
1	Ф.1 (оп.1-10)	268	СИП2 3х70+1х70		
2	Ф.1 (оп.11-20-30)	577	СИП2 3х70+1х70		
3	Ответвления к домам				

Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-1002 д.Коптево СРЭС

L										
							Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Внесение изменений в схему				Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.				
Nº	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись	Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
						Проверил				
						Чертил	Инженер	Буева М.С.		
